

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๐๑๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า


๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



สำเนาถูกต้อง


(นางนงญา ทองชว) ↓
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและปริมาณงานตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ ดังนี้

๑. ช่วงที่ ๑ (เดิม) กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling แก้ไขเป็น ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๗๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๑๘.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี Overlay หนา ๐.๐๓ ม.

๒. ช่วงที่ ๒ (เดิม) กม. ๐+๗๑๐ ถึง กม. ๒+๔๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

(นางนงุญา พงษ์พานิช)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ

๑,๗๐๐ เมตร **แก้ไขเป็น ช่วงที่ ๒** กม. ๐+๗๑๐ ถึง กม. ๒+๐๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร **และช่วงที่ ๓** กม. ๒+๐๑๐ ถึง กม. ๒+๔๑๐ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี Asphalt Hot Mix In-Place Recycling พร้อมดำเนินการติดตั้ง Guard Rail บริเวณทางตรงจากเดิม ๑๐๐.๘๐ เมตร **แก้ไขเป็นดำเนินการติดตั้ง Guard Rail เป็นระยะทาง ๘๘๐.๐๐ เมตร** เนื่องจากเป็นถนนเลียบรินคันคลองเพื่อลดอุบัติเหตุและเสริมความปลอดภัยในการสัญจร

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัครธัมภ์คุณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สำเนาถูกต้อง


(นางนฤยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดท่าอากาศยาน

สัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปุลณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๓๔

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง
เทศบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๓๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน โดยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายพงศกร เพชรประดับ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ปฏิบัติการ เป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒,๔๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมิซชากร

๑.๒ เรื่องขออนุมัติหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สป ๕๑๐๒๑/๓๔๐๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคกีดขวางการทำงาน โดยต้องดำเนินการปรับลดปริมาณงานให้สอดคล้องกับพื้นที่หน้างานปัจจุบันและแก้ไขงานท่อลอดระบายน้ำ ช่วง กม.ที่ ๒+๒๓๐ (เอกสารหมายเลข ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าดำเนินการซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำ ช่วง กม.ที่ ๒+๒๓๐ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร เห็นควรแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการและแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินให้ดำเนินการเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการและแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒
- เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงปริมาณ
เนื้องาน

สำเนาถูกต้อง

๐๐๕๒

(นาง **สำเนาถูกต้อง**)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


๒๕๖๕
/- จิงเรียนมาเพื่อ...


(นาง **นางญา ทอชชา**)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินที่แนบมาพร้อม
นี้ให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสรราช อินสุข)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประยัต สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสุชิน บุญมาเลิศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สรรพการเกษตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนุมัติ
ลงนามแล้ว



(นายธนภฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางนงกญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางนงกญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทร ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๕๑๕๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง
เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๓๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน โดยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายพงศกร เพชรประดับ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติกร เป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๐๒ บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒,๔๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชการ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ควบคุมงานได้ออกตรวจสอบพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริง ร่วมกับตัวแทนผู้รับจ้าง พบว่าสายทางดังกล่าว มีปัญหาและอุปสรรคจริงตามรายละเอียดที่แนบมา (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.๒ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ออกตรวจสอบสถานที่ และข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พบปัญหาและอุปสรรคของโครงการดังกล่าว และมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเข้าดำเนินการซ่อมแซมคันทางและท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ กม.ที่ ๒+๒๓๐ แล้วเสร็จ โดยเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

/๓.๒ ระเบียบ...

ส่วนราชการกองช่าง
ส่วนราชการกองช่าง

๒๕๖๔

๒๕๖๔

(นางสาวกัญญา ทองขาว)

(นางกัญญา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ.๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือทำงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ.๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

/ (๒) ในกรณี...

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

๕๕๕

(นางสาวอุษา ทองชา)

เจ้าพนักงาน (นางสาวอุษา ทองชา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สิ่งพิ้งงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

- ข้อ.๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันได้

ในกรณีที่มีการการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน หรือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณี...

สำนักงานถูกต้อง

 สำนักงานซื้อ

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน







- ๔ -

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ.๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔

- ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/๔.ข้อเสนอ...

สำเนาถูกต้อง

นฐร


(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาณ


(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาณ

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร เห็นควรแจ้งผู้รับจ้างให้หยุดงานและแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินให้ดำเนินการหยุดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทำการปรับลดปริมาณงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่หน้างานปัจจุบันและแก้ไขงานที่ล่อลุดระบาย ช่วง กม.ที่ ๒+๒๓๐ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินที่แนบมาพร้อมนี้ให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสรawat อินสุข)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประยัต สุขเกษม)
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว



(นายธนภุต อัดทะสัมปยุตนะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(นายสุทิน บุญมาเตีศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์. 0-3673-2106

E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ.871/2564

อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> ดำเนินปกติ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
เลขที่ใบ 6663	<input type="checkbox"/> สนับสนุนการ อบจ.ใน โครงการศึกษา	
2 S.A. 2564	<input type="checkbox"/> กองหอสมุด	
30 พฤศจิกายน 2564	<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
เวลา 19:49	<input type="checkbox"/> กองช่าง	<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบฯ

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างและขอหยุดงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 111/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

กองช่าง	<input type="checkbox"/> ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
เลขรับที่ 4718	<input type="checkbox"/> ฝ่ายเครื่องจักรกล
วันที่ 11/11/64	<input type="checkbox"/> ฝ่ายสาธารณสุขโรค
จำนวน 1 ชุด	<input type="checkbox"/> ฝ่ายผังเมือง
เวลา	

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้างงาน ทำงานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.1 - 0002 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นั้น เนื่องจาก ห้างฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณก่อสร้างร่วมกับช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแล้ว ปรากฏว่าพบปัญหาและอุปสรรคกีดขวางการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ช่วงที่ 1 ที่กม.0+000 - กม.0+710 พื้นที่หน้างานจริงมีความกว้าง 5.50 เมตร ในแบบการก่อสร้าง ระบุความกว้าง 6 เมตร
- ช่วงที่ 2 ที่กม.2+010 - กม.2+410 พื้นที่หน้างานจริงมีความกว้าง 7 เมตร ในแบบการก่อสร้าง ระบุความกว้าง 6 เมตร
- ในช่วง ที่กม.2+230 มีคันทางทรุดตัวและท่อระบายน้ำชำรุด

ดังนั้น ห้างฯ จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาแลอุปสรรค และทางห้างฯ จึงขอหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ไปจนกว่า องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้กับห้างฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วยจกเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

หม่อมหลวง... (Handwritten signature)

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล สิริพัฒนกุล)

ตำแหน่งผู้ควบคุม

ผู้จัดการ

โทร...
 - โทรสาร...
 วันที่ 30.0.64 ปก 14.00 น. (Handwritten notes)

(นายพงษ์กร เทชรประดับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(Handwritten signature)

(นางนงนุช ทองขาว) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปีงบประมาณ 2563

นายประจักษ์ วัฒนศิริ (กรรมการ) และ นายประจักษ์ วัฒนศิริ (กรรมการ)


วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓

[Signature]

[Signature]

๑๐๑๕

[Signature]



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง

เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

[Signature]

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

[Signature]

นายสุราษฎร์อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ

[Signature]

นายประหยัด สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ

[Signature]

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ความถูกต้อง
(นางนฤศยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุ

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
3.	งานผิวโทลทาง			
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
3.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	
3.3	Asphaltic Concrete			
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	3,125	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphalt Hot Mix in-Place Recycling	ตร.ม.	413	
	งานผิวทางเชื่อม			
3.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
3.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	
3.3	Asphaltic Concrete ทน 5 ชม.	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	413	
	-Asphalt Hot Mix in-Place Recycling	ตร.ม.	-	
4	งานตีเส้นจราจร			
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง, สีขาว)	ตร.ม.	312.5	
4.2	Rumble Strips	ตร.ม.	30.50	
4.3	เส้นหยุด	ตร.ม.	3.60	
4.4	ทางม้าลาย	เมตร	-	

บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1.	งานดินคันทาง			
1.1	งานรื้อถอนทางหัวล้อคอนกรีตและขอบคันหินคอนกรีต	ตร.ม.	-	
1.2	งานเคลือบปรับให้ล้าทางเดิมแล้วทับ (โพลีเอสเตอร์)	ตร.ม.	-	
1.3	งานปรับดินเดิมแล้วทับ	ตร.ม.	-	
1.4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	
1.5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	
1.6	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	
1.7	งานวัดจุดตัดเพื่อขอบคัน	ลบ.ม.	-	
1.8	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	
1.9	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	
1.10	หินคลุกปรับระดับ (หยาบ)	ลบ.ม.	-	
1.11	Skin Patch	ตร.ม.	-	
1.12	Deep Patch	ตร.ม.	-	
1.13	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	
2.	งานผิวทาง			
2.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	
2.2	TACK COAT	ตร.ม.	3,905	
2.3	Asphaltic Concrete			
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	3,905	
	-Asphalt Hot Mix in-Place Recycling	ตร.ม.	10,600	

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด



นายสุทธศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ



นายสราวุธ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ



นายประยัตน์ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ



นายพงษ์ศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(นางนงนุช ทองชกา)

สำเนาถูกต้อง

ควบคุมงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

บัญชีปริมาณงานบ้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
5.	งานตรวจสอบเครื่องจักร			
5.1	งานปรับปรุง			
5.1.1	หมักแควโด่ง ค.ศ.ด.	หมัก	-	
5.1.2	หมักทีโอมตร	หมัก	-	
5.1.3	บ้ายจรง	ชุด	-	
5.1.4	GUARD RAIL	เมตร	-	
5.1.5	สะพาน ค.ศ.ด.	เมตร	-	
5.2	งานติดตั้ง			
5.2.1	บ้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	-	
5.2.2	บ้ายจรงแบบ น1	ชุด	4	
5.2.3	บ้ายจรงแบบ น2	ชุด	-	
5.2.4	บ้ายจรงแบบ น3-น55	ชุด	2	
5.2.5	บ้ายจรงแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	ชุด	4	
5.2.6	บ้ายจรงแบบ ค28-ค30,ค62	ชุด	-	
5.2.7	บ้ายจรงแบบ ต61	ชุด	-	
5.2.8	บ้ายจรงแบบ ค63,ค66	ชุด	-	
5.2.9	บ้ายจรงแบบ ค64,ค67	ชุด	-	
5.2.10	บ้ายจรงแบบ ค65,ค68,ค70	ชุด	-	
5.2.11	บ้ายจรงแบบ ค69	ชุด	-	
5.2.12	บ้ายจรงแบบ ค71	ชุด	-	
5.2.13	บ้ายจรงแบบ ค72-ค73	ชุด	-	
5.2.14	บ้ายจรงแบบ ค74	ชุด	-	
5.2.15	บ้ายจรงแบบ ค76	ชุด	-	
5.2.16	บ้ายจรงแบบ ค77	ชุด	-	

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด


นายสุรศักดิ์ สมนักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ


นายสุรวิช อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ


นายประหัต สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ


นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร


นายประจักษ์
หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน


บัญชีปริมาณงานบ้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
5.2.17	บ้ายจรงแบบ น1	ชุด	-	
5.2.18	บ้ายจรงแบบ ค78	ชุด	-	
5.2.19	บ้ายจรงแบบ น1/1	ชุด	-	
5.2.20	บ้ายจรงแบบ น2 (1 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.21	บ้ายจรงแบบ น2 (2 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.22	บ้ายจรงแบบ น2 (3 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.23	บ้ายจรงแบบ น2 (4 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.24	บ้ายจรงแบบ น3 (1 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.25	บ้ายจรงแบบ น3 (2 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.26	บ้ายจรงแบบ น3 (3 แค้นบ้าย)	ชุด	-	
5.2.27	บ้ายจรงแบบ น4	ชุด	-	
5.2.28	บ้ายจรงแบบ น5	ชุด	-	
5.2.29	บ้ายจรงแบบ น6	ชุด	-	
5.2.30	บ้ายจรงแบบ น7	ชุด	-	
5.2.31	บ้ายจรงแบบ น8	ชุด	-	
5.2.32	บ้ายจรงแบบ น3-น55+ค1-ค27,ค31-ค60,ค75	ชุด	-	
5.2.33	บ้ายจรงแบบ น3-น55+ค28-ค30	ชุด	-	
5.2.34	บ้ายจรงแบบ น3-ค55+ค71	ชุด	-	
5.2.35	บ้ายจรงแบบ น3-น55+บ72-ค73	ชุด	-	
5.2.36	บ้ายจรงแบบ ต1-ค27+ค74,ค31-ค60+ค74	ชุด	-	
5.2.37	บ้ายจรงแบบ ต1-ค27+ค75,ค31-ค60+ค75	ชุด	-	
5.2.38	บ้ายจรงแบบ ต1-ค27+ค76,ค31-ค60+ค76	ชุด	-	
5.2.39	บ้ายจรงแบบ ต1-ค27+ค77,ค31-ค60+ค77	ชุด	-	
5.2.40	บ้ายจรงแบบ ต1-ค28+ค75,ค31-ค60+ค78	ชุด	-	



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ตบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง

เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

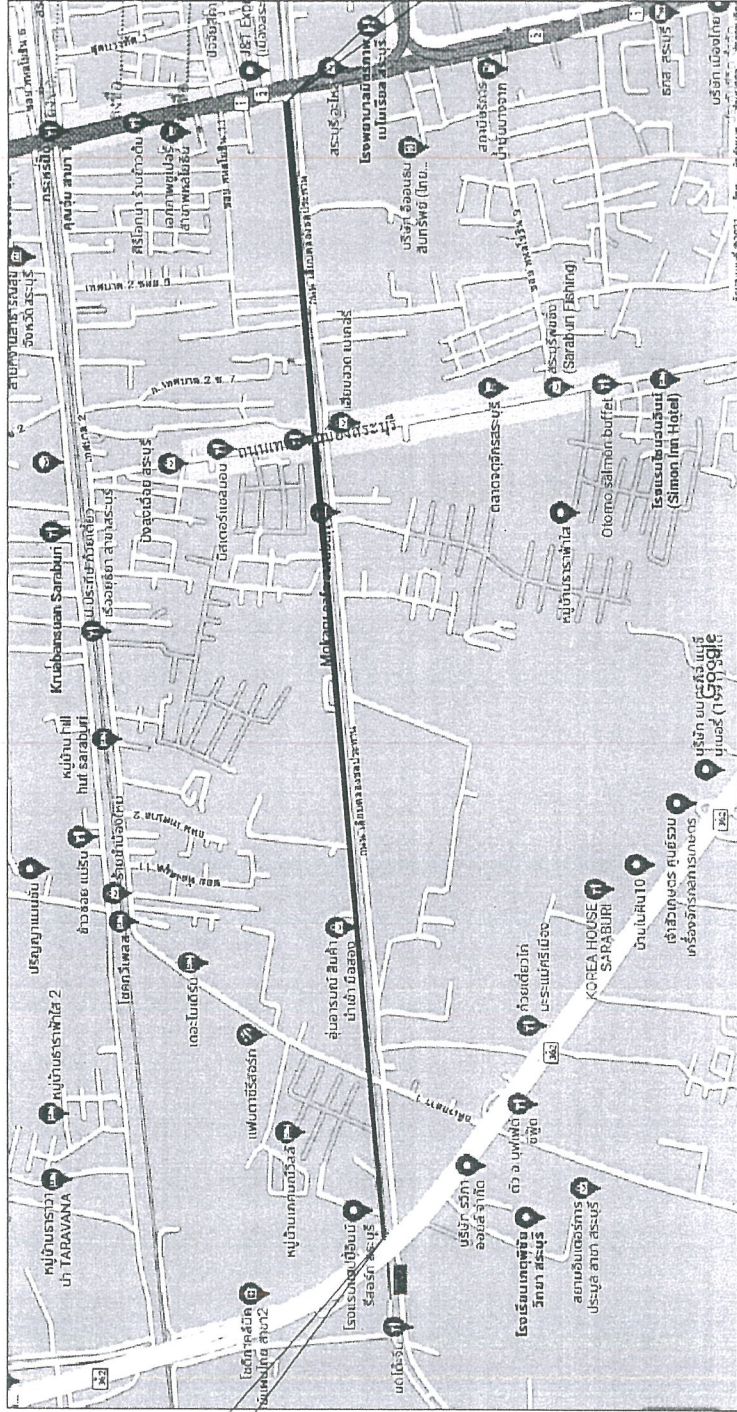

จุดสิ้นสุดโครงการ
กม.ที่ 2+410
N=14.520455
E=100.890637


จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ 0+000
N=14.522431
E=100.913975


เอกสารแนบท้ายสัญญา... หน้า ๑๐
นาย...
วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๕


สถานที่ สาย ตบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัตถุประสงค์ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+710 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 710 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+710 ถึง กม.ที่ 2+010 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 2+010 ถึง กม.ที่ 2+410 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร

ผังโดยสังเขป


ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและรายละเอียด


นายสุรศักดิ์ สัมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสราวุธ อินสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



นายประสิทธิ์ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


กรรมการฯ


นายพงศ์กร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
ผู้อำนวยการศูนย์ช่าง
อำนาจพิเศษ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง

เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

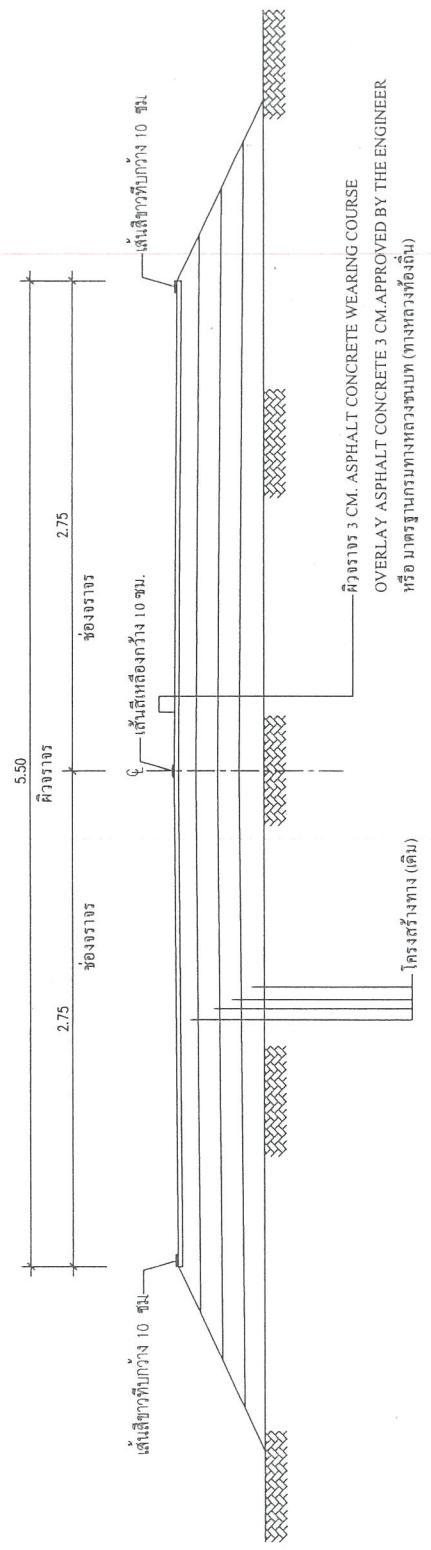

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT CONCRETE (Overlay)
 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+710 ระยะทาง 710 เมตร

แบบร่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง/แก้ไขแบบ/แก้ไขแบบ (ฉบับแก้ไข)
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... พยอม
 ลงชื่อ..... พยอม

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด


นายสุรศักดิ์ สมภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ
 นายสรวิศ อินสุข
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายประหยัด สุขเกษม
 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ

นายพงศกร เพชรประคับ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ




ชำนาญพล


ความคุมงาน
 (นางนงนุช ทองขาว)
 หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง

เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แบบร่างแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ผู้รับจ้าง: 
 ผู้รับจ้าง: 

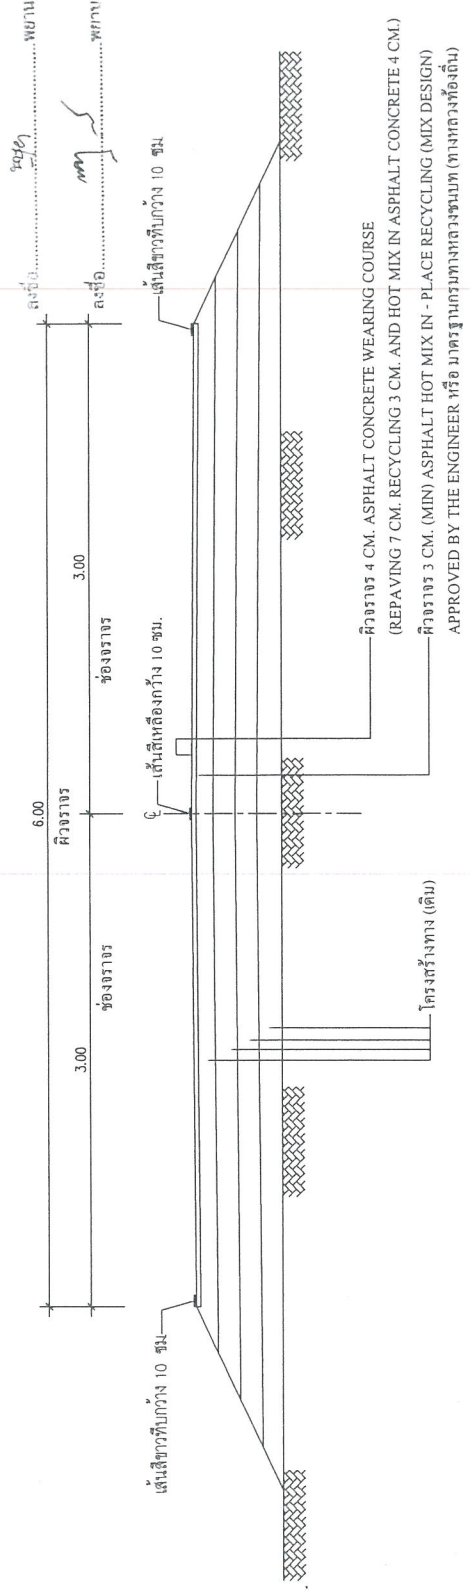


งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX CONCRETE ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+710-กม.ที่ 2+010 ระยะทาง 1,300 เมตร

จอมนูมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด


 นายสุรศักดิ์ สมภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ
 นายสรวิทย์ อินสุชา
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


 นายประหทัย สุขเกษม
 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ

สัญญาจ้าง
 ความคุมงาน
 (นางนงนุช ทองขาว)
 นายพงศกร เพชรประดับ
 วิศวกรโยธา
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง


เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

๑๑๖/๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๐๖/๒๕๖๕)



นางสาว..... พยาน
นาย..... พยาน

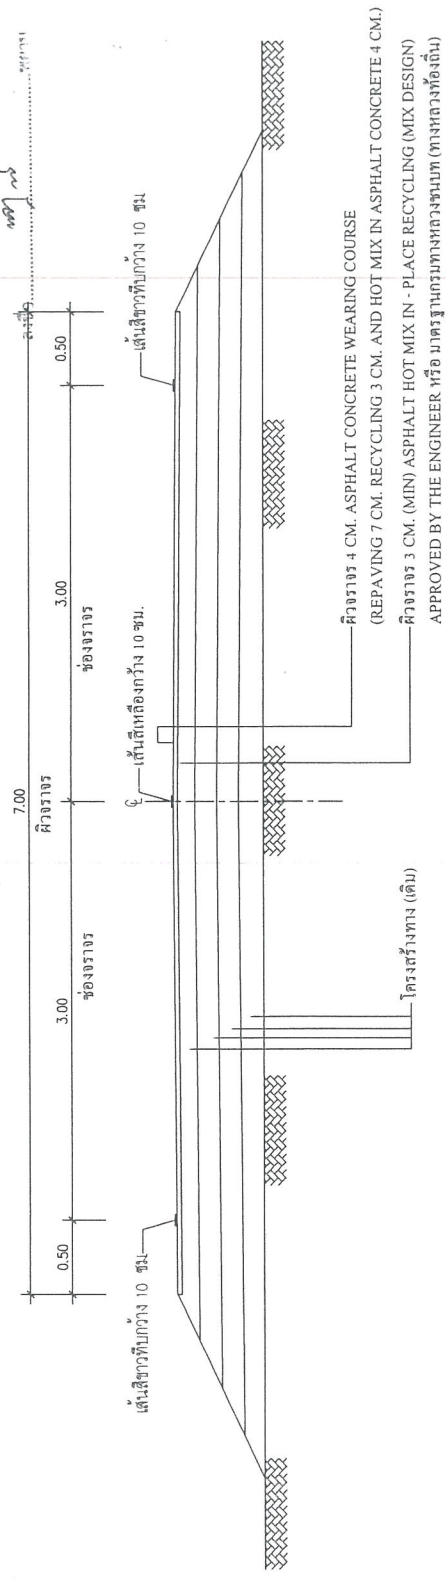

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX CONCRETE ช่วงที่ 3 กม.ที่ 2+010-กม.ที่ 2+410 ระยะทางยาว 400 เมตร

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

นายสุรวิทย์ อินสุย
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ

นายประยงค์ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ

นายพงศกร เพชรปรีชามังการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่งคือ

นางสาว..... (นางสาววิภา ทอชชาว)
นางสาว..... (นางสาววิภา ทอชชาว)
นางสาว..... (นางสาววิภา ทอชชาว)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง


เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๑๑๑/๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน

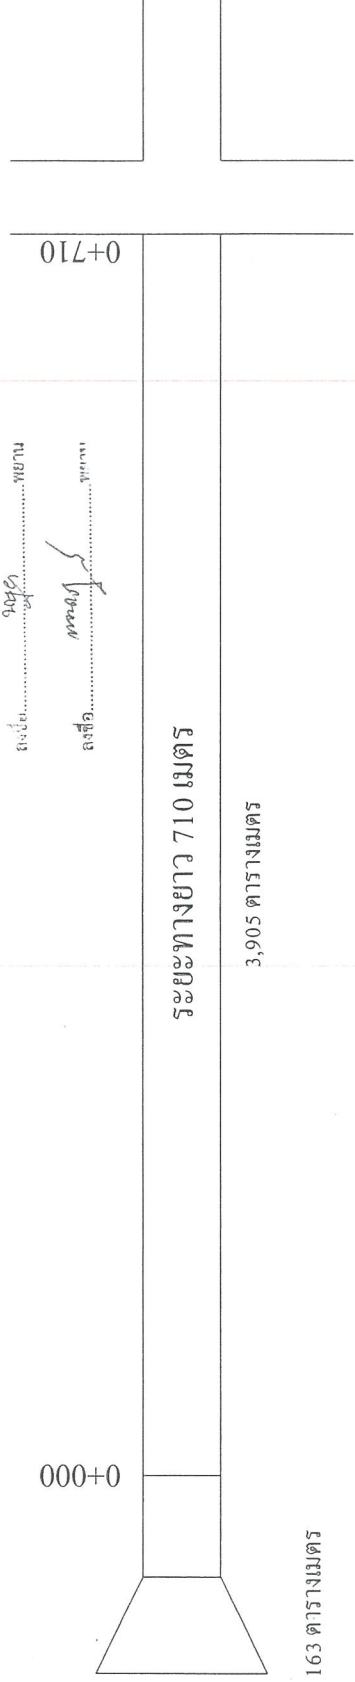

ทางเชื่อม 163 ตารางเมตร

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT CONCRETE (Overlay)

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+710 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 710 เมตร

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ

นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

นายศุภวราฐ อินสุช
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายประหทัย สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ดำเนินการคือ

นางสาว.....
ความคุมงาน
(นางพัญญา ทองขาว)
นายพงศกร เพชรสุรินทร์ (นางพัญญา ทองขาว)
วิศวกร โยธาปฏิบัติกร

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.1-0002 บ้านปากเปรี้ยว - บ้านโคกสว่าง


เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๑๑๑/๒๕๖๕ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๖.๑๖)

๑๕.๒๒๕

๑๕.๒๒๕

๑๕.๒๒๕

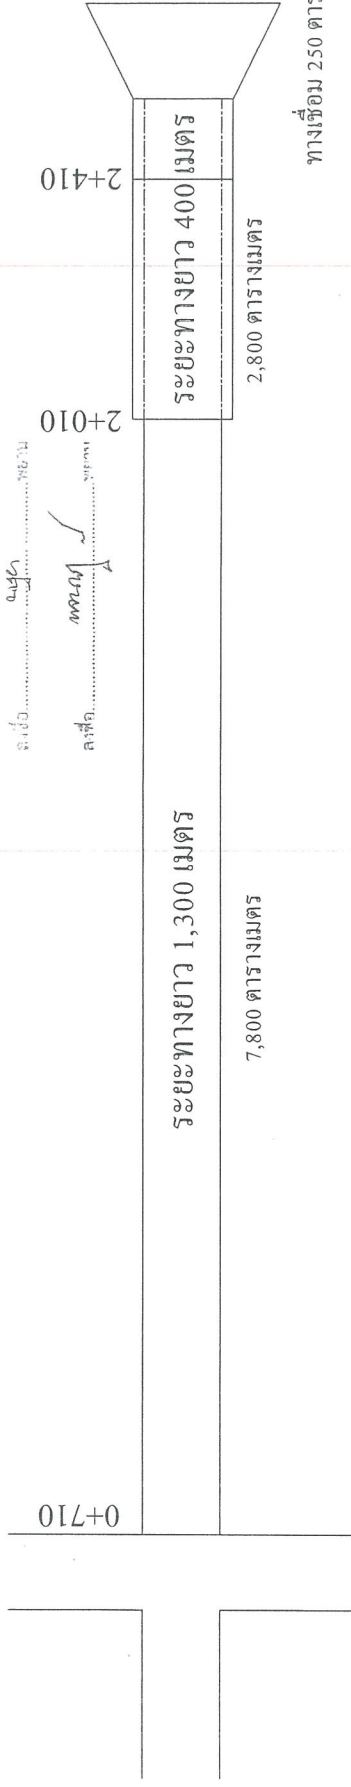

งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX CONCRETE

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+710-กม.ที่ 2+010 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร

ช่วงที่ 3 กม.ที่ 2+010-กม.ที่ 2+410 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 400 เมตร

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด




นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง



ประธานกรรมการฯ

นายสุราษฎร์ อินตุง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



กรรมการฯ

นายประหยัด ตูจเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

สำเนาถูกต้อง



กรรมการฯ


นายพงศกร เพชรประดิษฐ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ค.ช.
ควบคุมงาน
(นางสาวกัญญา พงษ์ขจร)

นางสาวกัญญา พงษ์ขจร
หัวหน้างานพัสดุช่างโยธา


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว - บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

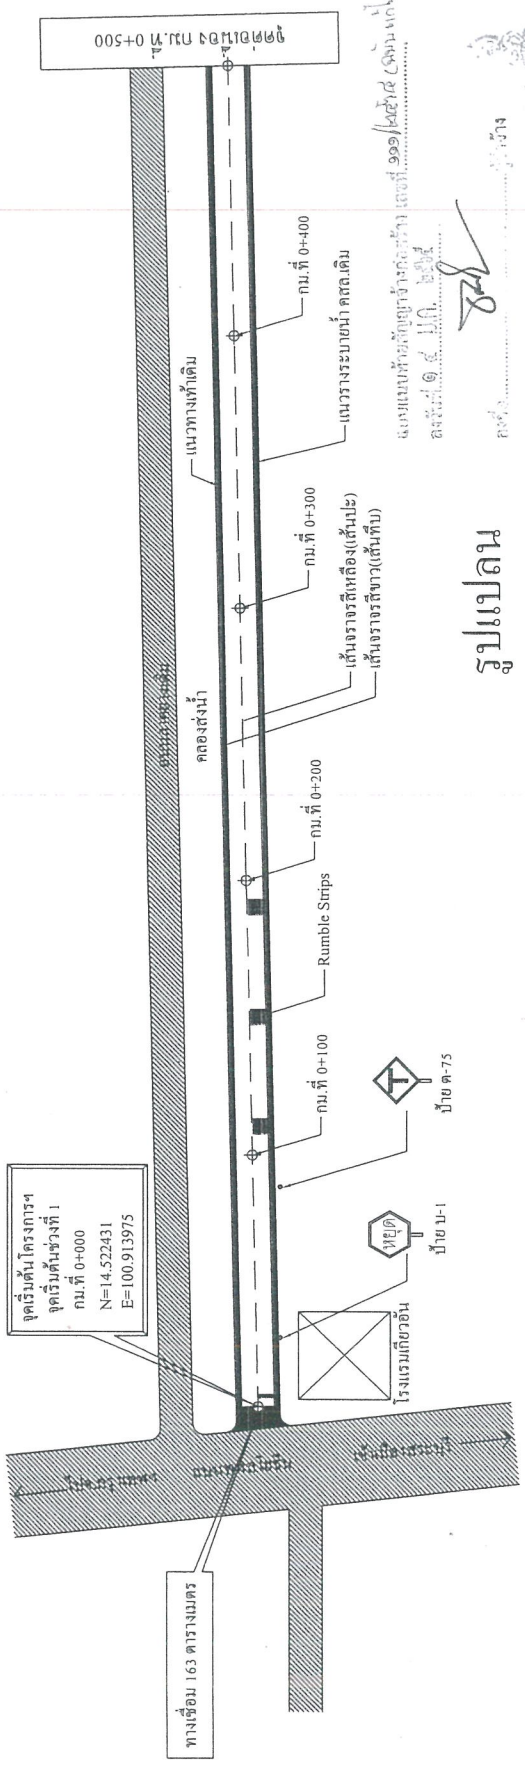

รูปแปลน

แบบแปลนท้ายสัญญา (ฉบับแก้ไข) เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔ (ถนนเทศบาลเมืองสระบุรี ๑) ส.๑๑๑

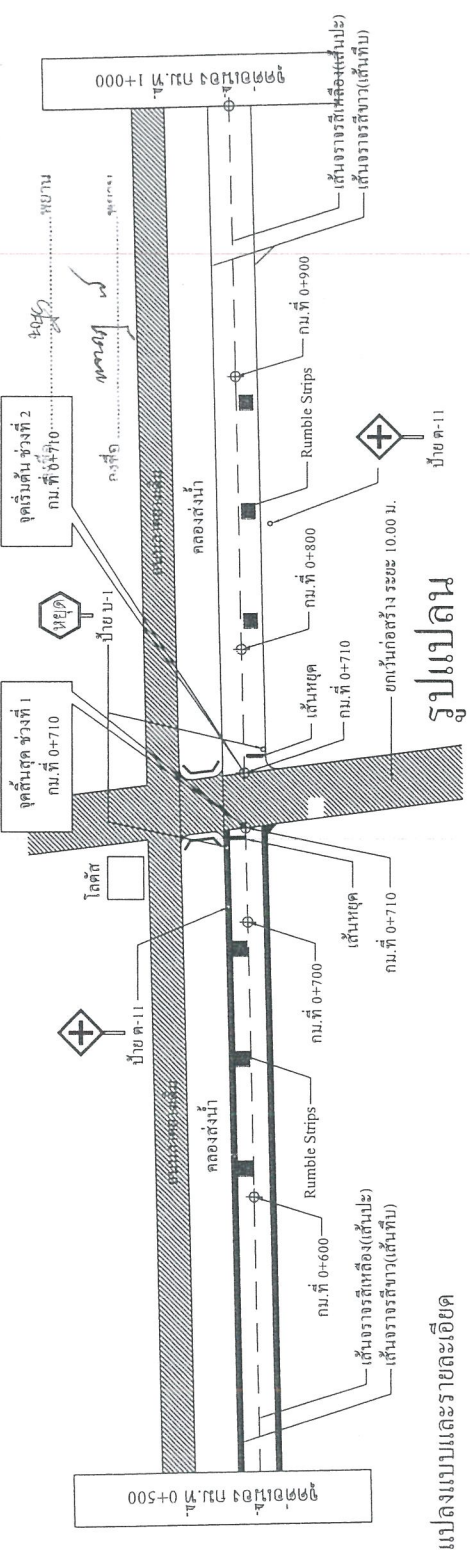

รูปแปลน

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

สำเนาถูกต้อง

นางสุรศักดิ์ สมภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุรวิทย์ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายประสิทธิ์ อิ่มสุข
หัวหน้าฝ่ายตรวจและออกแบบ

นายสุรวิทย์ สุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล


ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

นายพจนานันท์ วัฒนวงษา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สป.ถ1-0002 บ้านปากเพ็ญ - บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

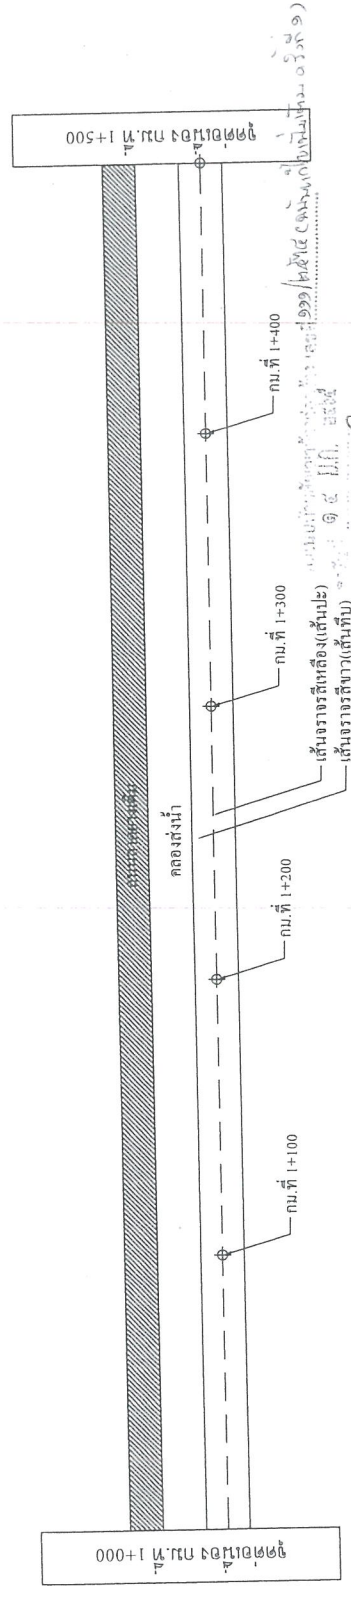

รูปแปลน

ผู้รับจ้าง
.....
.....

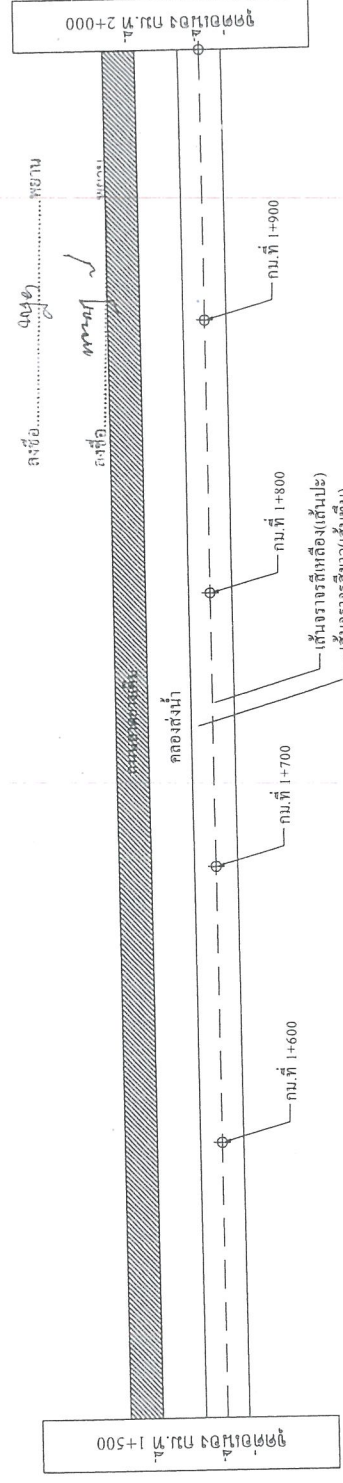

ลงชื่อ..... พชยาน
ลงชื่อ.....

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

สำนักงานท้องถิ่น

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

นายสุรวิทย์ อิ่มสุข
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ

นายประจักษ์ ตูซเกษม
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

กรรมการฯ

นายพงศ์กร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร


นางสาว.....
นางสาว.....
นางสาว.....

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย สป.ถ.1-0002 บ้านปากเพ็ญ - บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แบบแปลนปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
 ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชื่อ.....ผู้จ้าง
 ชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ชื่อ.....พยาน
 ชื่อ.....พยาน
 ชื่อ.....พยาน

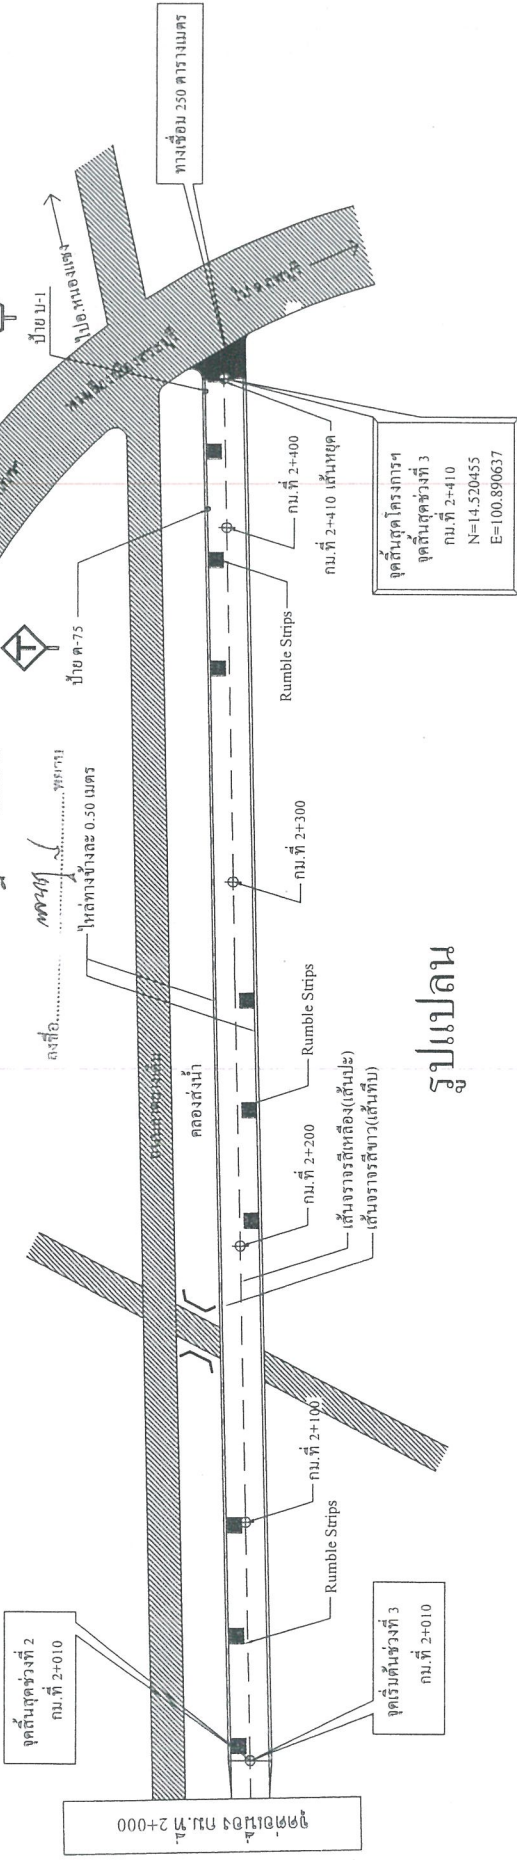

รูปแปลน

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการฯ

นายประหัด สุขเกษม
 หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ดำเนินการต่อ

นาย.....
 (นางมยุรี ทองขาว)
 นายพงษ์พรพงษ์ประสิทธิ์
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

