

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนภุต อัดละสัมบูรณ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๓๔๑ ซอย ๓ ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายศุภกร แสงอริยวนิช (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๓๑๒๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน- อ.คอนพุท จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่าบริเวณ โครงการ ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ กม.ที่ ๕+๕๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๑+๕๗๕ มีการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อม เครื่องหมายบนผิวทาง (เส้นจราจร) กว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยสำนักงานเทศบาลตำบล คอนพุท ตามหนังสือเลขที่ สป ๖๒๕๐๘/๕๕๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป.๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน- ค.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.คอนพุท จ.สระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนภุต อัดละสัมบูรณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวยุรธนา ภาอิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไข ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นการใช้จ่ายเงินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทำให้ทางราชการ เสียหาย จึงมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงานแก้ไขแบบแปลน แก้ไขวงงาน งดเงิน ให้ตรงกับปริมาณ งานก่อสร้างจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ตัดลดปริมาณงาน ตัดลดเงินค่าก่อสร้าง แก้ไขวงงาน งดเงิน ดังนี้

๒.๑ ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๕+๕๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๑+๕๗๕ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

๒.๑.๑ งานขุดไถผิวทางแอสฟัลท์เดิมลึก ๐.๑๐ เมตร (Milling) เป็นเงิน ๑๔๗,๔๕๖.- บาท

๒.๑.๒ งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ขุดตัด) ชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือกลึก ๐.๔๐ เมตร เป็นเงิน ๑๕๓,๓๑๖.๘๐ บาท

๒.๑.๓ งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ขุดตัด) ดิน ลึก ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๒๒๕,๕๗๕.๒๐ บาท

๒.๑.๔ งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด เป็นเงิน ๑๓๓,๐๘๐.- บาท

๒.๑.๕ งานวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีตเดิมและวัสดุชั้นรองพื้นเดิม บดอัดแน่น ๐.๓๐ เมตร เป็นเงิน ๒๓๔,๑๔๘.๓๒ บาท

๒.๑.๖ งานวัสดุคัดเลือก หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๗๒๐,๒๖๖.๗๑ บาท

๒.๑.๗ งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๖๕๑,๖๓๐.๕๖ บาท

๒.๑.๘ งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๘๖๔,๒๔๘.๕๗ บาท

๒.๑.๙ งาน PRIME COAT (งานผิวทาง) เป็นเงิน ๓๑๐,๒๗๒.- บาท

๒.๑.๑๐ งานผิวจราจร Asphalt Concrete เป็นเงิน ๒,๔๔๘,๔๘๐.- บาท

๒.๑.๑๑ สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๑๕๑,๘๐๕.๘๒ บาท

๒.๑.๑๒ งาน Rumble Strip เป็นเงิน ๖,๕๕๖.๗๕ บาท

๒.๑.๑๓ เสาไฟนวัตกรรม เป็นเงิน ๕๒,๖๐๓.๒๕ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๖,๑๐๓,๘๘๐.๔๒ บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๔๘,๕๕๖,๑๑๕.๕๕ บาท ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดงานแนบท้าย

๓. บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและตัดลดค่างานเป็นเงินจำนวน ๖,๑๐๓,๘๘๐.๔๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๘,๕๕๖,๑๑๕.๕๕ บาท ระยะเวลาก่อสร้างเท่าเดิมรายละเอียด ตามหนังสือบริษัทฯ ที่ นส.๐๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภกร แสงอริยานิช)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๖๐๔,๖๗๒.๕๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานดินคันทาง ประกอบด้วย

-งานขุดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม (แล้วเสร็จ)

-งานตัด - ขุดหรือชั้นทางเดิม (แล้วเสร็จ)

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

-งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพร้อมจัดทำ Profile และ Crossection แล้วเสร็จ

-งานวัสดุทางเดิม,งานวัสดุคัดเลือก,งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง,งานพื้นทางปรับเกลี่ยแต่งและ

บดอัด (แล้วเสร็จ)

- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๒ งานดินคันทาง ประกอบด้วย

-งานขุดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม (แล้วเสร็จ)

-งานตัด - ขุดหรือชั้นทางเดิม (แล้วเสร็จ)

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

-งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพร้อมจัดทำ Profile และ Crossection (แล้วเสร็จ)

-งานวัสดุทางเดิม,งานวัสดุคัดเลือก,งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง,งานพื้นทางปรับเกลี่ยแต่งและ

บดอัด (แล้วเสร็จ)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



-งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

-งานวัสดุทางเชื่อม, งาน Prime Coat, งาน Tack Coat , งาน Asphalt concrete

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๒ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

-งานวัสดุทางเชื่อม, งาน Prime Coat, งาน Tack Coat , งาน Asphalt concrete

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ งานอื่นๆ ประกอบด้วย

-งานป้ายจราจร (แล้วเสร็จ)

-งานสีตีเส้นจราจร, งานเครื่องหมายจราจร, หลัคนำโค้ง(แล้วเสร็จ)

-งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเดิม(แล้วเสร็จ)

-ป้ายโครงการและงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ

ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี ชื่อบัญชีบริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เลขที่บัญชี๑๑๕๖๐๖๒๗๘๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณภา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

-งานวัสดุทางเชื่อม,งาน Prime Coat,งาน Tack Coat , งาน Asphalt concrete

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ช่วงที่ ๒ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

-งานวัสดุทางเชื่อม,งาน Prime Coat,งาน Tack Coat , งาน Asphalt concrete

เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๗,๑๕๐,๓๑๕.๕๕ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ งานอื่นๆ ประกอบด้วย

-งานป้ายจราจร (แล้วเสร็จ)

-งานสีตีเส้นจราจร, งานเครื่องหมายจราจร, หลัคนำโค้ง(แล้วเสร็จ)

-งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเคม(แล้วเสร็จ)

-ป้ายโครงการและงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี ชื่อบัญชีบริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เลขที่บัญชี๑๑๕๖๐๖๒๗๘๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ซึ่งไม่ทำให้ ราชการเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน เท่าเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้อง ทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดละสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ


สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัททะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุภกร แสงอริขวนิช)
กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวบุรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวบุรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ แก้ไขปรับลด
ปริมาณงาน แก้ไขแบบแปลน แก้ไขวงงาน วงเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๔๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.ถ.๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโคน-บ้าน
ทองย้อย ต.หนองโคน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโคน - อ.คอนพุด จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๘,๘๔๕,๘๐๐.๐๐			๘,๘๔๕,๘๐๐.๐๐
๔	๔	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	๕	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๗,๑๕๐,๓๑๘.๕๘			๗,๑๕๐,๓๑๘.๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวรรณดา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุกกร แสงอริยนิช)

กรรมการผู้จัดการ **สำเนาถูกต้อง**

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออจดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(นางสาวสุวรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ หน้า




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)


กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๙๒๖๖

วันที่ ๒๗/ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สบ.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)

๒. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน ๕ งาน โดยบริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง มีปริมาณงานดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว ๗,๕๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

ข้อเท็จจริง

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าบริเวณโครงการ ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ กม.ที่ ๙+๙๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๑+๕๗๕ มีการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมเครื่องหมายบนผิวทาง (เส้นจราจร) กว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นระยะทางยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร โดยสำนักงานเทศบาลตำบลดอนพุด ตามหนังสือเลขที่ สบ ๖๒๕๐๘/๕๙๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สบ.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างมีการประชุมกันหลายครั้งเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นการใช้งบของราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย จึงมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงานแก้ไขแบบแปลน แก้ไขวงงาน งานเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ช่วงที่ ๒ กม. ที่ ๙+๙๗๕ ถึง กม. ที่ ๑๑+๕๗๕ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

๒.๑.๑ งานชุดไสผิวทางแอสฟัลท์เดิมลึก ๐.๑๐ เมตร (Milling) เป็นเงิน ๑๔๗,๔๕๖.๐๐-บาท

๒.๑.๒ งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง (ดิน - ชุดตัด) ชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก ลึก ๐.๔๐ เมตร เป็นเงิน ๑๕๓,๓๑๖.๘๐.-บาท

/๒.๑.๓ งานตัด ...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒.๑.๓ งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง (ดิน - ขุดตัด) ดิน ลึก ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๒๒๙,๙๗๕.๒๐.๐๐.-บาท

๒.๑.๔ งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด เป็นเงิน ๑๓๓,๐๘๐.๐๐.-บาท

๒.๑.๕ งานวัสดุแอลพีลท์คอนกรีตเดิมและวัสดุชั้นรองพื้นเดิม บดอัดแน่น ๐.๓๐ เมตร เป็นเงิน ๒๓๔,๑๔๘.๓๒.-บาท

๒.๑.๖ งานวัสดุคัดเลือก หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๗๒๐,๒๖๖.๗๑.-บาท

๒.๑.๗ งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๖๕๑,๖๗๐.๕๖.-บาท

๒.๑.๘ งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หิน ๐.๒๕ เมตร เป็นเงิน ๘๖๔,๒๔๘.๙๗.-บาท

๒.๑.๙ งาน PRIME COAT (งานผิวทาง) เป็นเงิน ๓๑๐,๒๗๒.๐๐.-บาท

๒.๑.๑๐งานผิวจราจร Asphalt Concrete เป็นเงิน ๒,๔๔๘,๔๘๐.๐๐.-บาท

๒.๑.๑๑สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง + สีขาว) เป็นเงิน ๑๕๑,๘๐๕.๘๒.-บาท

๒.๑.๑๒งาน Rumble Strip เป็นเงิน ๖,๕๕๖.๗๙.-บาท

๒.๑.๑๓เสาไฟนวัตกรรม เป็นเงิน ๕๒,๖๐๓.๒๕.-บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๖,๑๐๓,๘๘๐.๔๒.-บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๔๘,๙๙๖,๑๑๙.๕๙.-บาท ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดงาน (เอกสารหมายเลข ๑)

๒.๒ แก้ไขแบบก่อสร้างให้ตรงตามรายการปรับลดปริมาณงานยกเลิกเอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๒.๑ หน้า ๔,๗,๑๗,๑๘,๑๙ โดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๓ แก้ไขวงงานในสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยใช้งวดงานที่ปรับแก้ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๔ ตามสัญญาจ้างข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้รับจ้างในการบอกเลิกสัญญา วันเริ่มทำงาน วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่กระทบและยังคงระยะเวลาการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง

๒.๕ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมไม่ขยายเวลาปฏิบัติงาน และยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตามหนังสือ นส.๐๙๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (นางสาวสุวรรณา ภาณี)

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม **หลักวิชาการพัสดุชำนาญการ**

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการข้างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ พัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ เป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพัก งานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ พัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชวรัตน์ ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้งานก่อสร้างไม่เกิดการล่าช้า เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณของราชการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้าง แก้ไขวงงาน งดเงิน ตามรายละเอียดข้อเท็จจริง ข้อ ๒ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายนายพรชัย แก้วบังวัน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสรารัฐ อ้นสุข)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายวรุดิ อยู่พันธ์)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

อนุมัติ

(นายอนนารถ อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา กham)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



อบจ.สระบุรี สำนักปลัด อบจ. กองส่งเสริมสุขภาพ
 เลขที่ 545/ว.ร.น.ท. กองส่งเสริมการเกษตร กองบริหารราชการ
 วันที่ 9/3/15 กองบริหารการคลัง กองคลัง
 เวลา 15.43 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนพุด กองตรวจเจ้าหน้าที่
 ถนนโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสระบุรี โทร. ๐๘๒๒๑๑๖๖๖๖
 สืบหาคน ๒๕๖๕

ที่ สป ๖๒๕๐๔/๕๔๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป.ถ.๐๐๓๗
 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน
 ตำบลดอนทอง-ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๕/๕๘๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

จังหวัดสระบุรี ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 เลขที่ ๖๖๖/๒๕๖๕ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 วันที่ 10/3/15 ฝ่ายเครื่องจักรกล
 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฝ่ายสารานุกรม
 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฝ่าย...

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนพุด ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณแยกวัดบ้านรี - สะพาน คสล. บ้านสมอลน หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๗
 ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร
 หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๕,๒๓๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนมีสภาพผิวจราจรชำรุดทรุดตัวเสียหาย
 ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เทศบาลตำบลดอนพุด
 จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นการเร่งด่วน
 รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๒ โดยเทศบาลตำบลดอนพุด ได้ประสานขออนุญาตมายังท่านในการใช้สาย
 ทางที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนพุด
 หมายเลขสายทาง สป.ถ ๑-๐๐๓๗ ชื่อสายทาง บ.หนองโดน - บ.ทองย้อย ช่วงบริเวณแยกวัดบ้านรี -
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสมอลน หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัด
 สระบุรี เพื่อทำการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
 ประชาชน และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตำบลดอนพุด
 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ นั้น

เทศบาลตำบลดอนพุด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง
 แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณแยกวัดบ้านรี - สะพาน คสล. บ้านสมอลน หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่
 ๗ ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๕,๒๓๓,๐๐๐บาท เสร็จเรียบร้อย
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร เพชรประดับ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


(นายไพศาล ขำวงษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลดอนพุด

(นางสาวยุวรัตดา ภาชี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองช่าง
 โทร.๐-๓๖๓๘-๕๐๓๔ ต่อ ๑๔

นายจิรพล บุญลือ
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 11 ธ.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง : ...

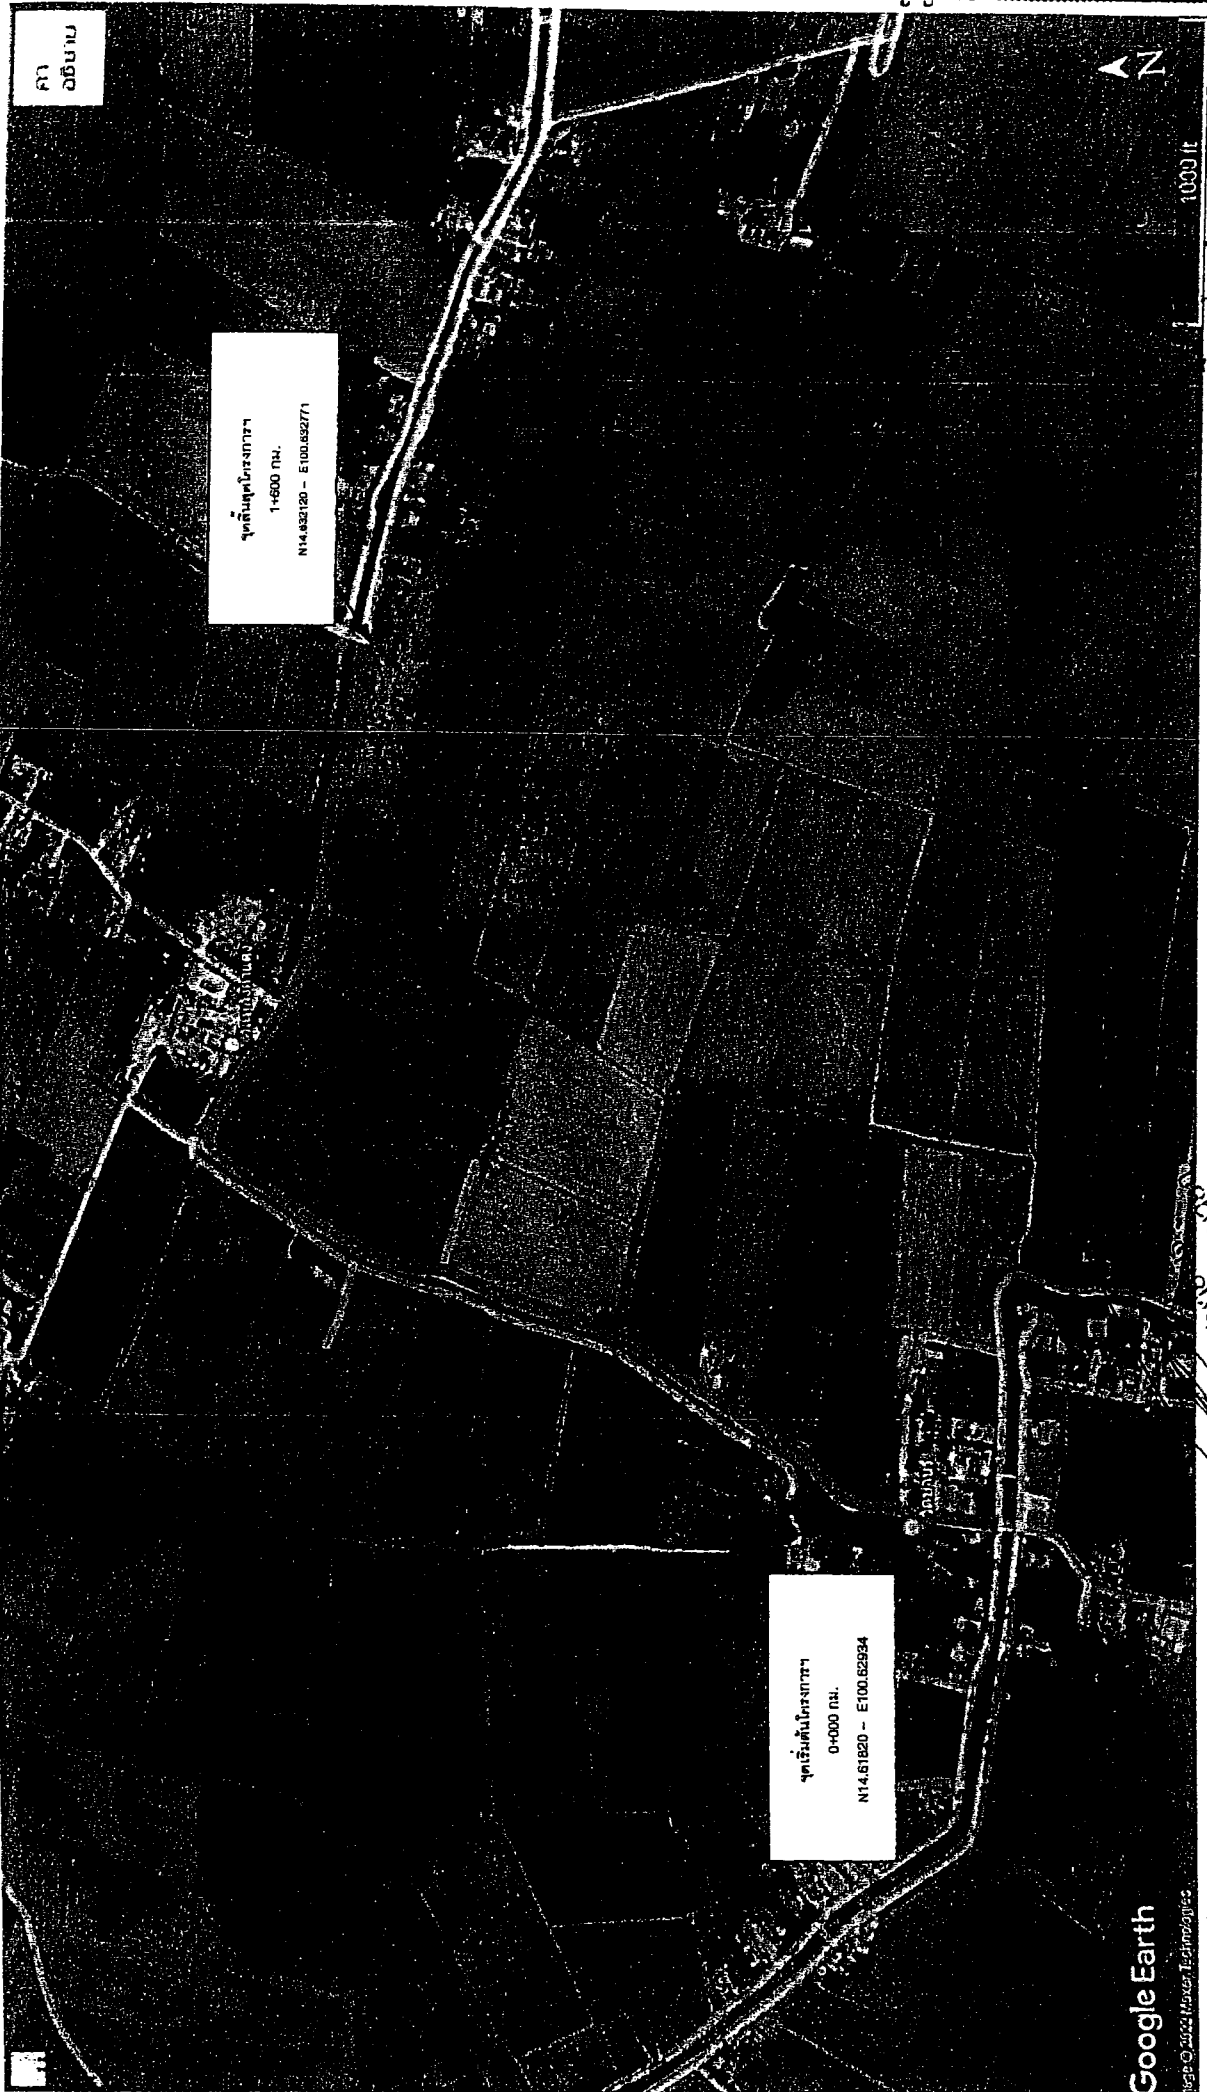

คา
วธิยาน

จุดสิ้นสุดโครงการ
1+600 กม.
N14.632120 - E100.62771

จุดเริ่มต้นโครงการ
0+000 กม.
N14.61820 - E100.62984



1000 ft
วิศวกรโครงการนายเปรม

ผังบริเวณโดยสังเขป



บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 341 ซอย.....
สาขา.....

อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> 1. งบค่าวัสดุ	<input type="checkbox"/> 2. งบค่าแรงงาน
เลขที่รับ 6709	<input type="checkbox"/> 3. งบค่าเช่า	<input type="checkbox"/> 4. งบค่าวัสดุสิ้นเปลือง
วันที่ 16 มิ.ย. 66	<input type="checkbox"/> 5. งบค่าขนส่ง	<input type="checkbox"/> 6. งบค่าประกันภัย
เวลา 15:05	<input type="checkbox"/> 7. งบค่าภาษี	<input type="checkbox"/> 8. งบค่าอื่น ๆ

ที่ นส.099/2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

เรื่อง ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
 เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
 อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 22/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

สำเนา อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 6709 วันที่ 16 มิ.ย. 66
<input type="checkbox"/> 1. งบค่าวัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/> 2. งบค่าแรงงาน
<input type="checkbox"/> 3. งบค่าเช่า	<input type="checkbox"/> 4. งบค่าวัสดุสิ้นเปลือง
<input type="checkbox"/> 5. งบค่าขนส่ง	<input type="checkbox"/> 6. งบค่าประกันภัย
<input type="checkbox"/> 7. งบค่าภาษี	<input type="checkbox"/> 8. งบค่าอื่น ๆ

ตามสัญญาที่อ้างถึง (1) บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.ถ1 - 0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี นั้น

ตามที่อ้างถึง (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งเปลี่ยนแปลงปริมาณงานเนื่องงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำการแก้ไข ปรับปรุงแบบแปลนดังกล่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ดังนี้

1. ปรับลดเนื้อหา แอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 2 กม. ที่ 9+975 ถึง กม.ที่ 11+575 ระยะทาง 1,600.00 เมตร
2. ปรับลดเนื้อหา สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง จำนวน 539.85 ตารางเมตร
3. ปรับลดเนื้อหา Rumble Strip จำนวน 14.70 ตารางเมตร
4. ปรับลดเนื้อหา เสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 35.00 ต้น

รวมเป็นเงินที่ต้องปรับลด 6,103,880.42 บาท เหลือยอดเงินเท่ากับ 48,996,119.59 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ทางบริษัทฯ ยืนยันและยินยอมในการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้าง โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ 48,996,119.59 บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาก่อสร้างเท่าเดิม ตามสัญญาดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ทางบริษัทฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวยุววรรณ ภาษี)
 นักวิชาการพิเศษชำนาญการ




ขอแสดงความนับถือ

 (นายศุภกร แสงอริยมัช)
 กรรมการผู้จัดการ

(นายทศกร เพชรประดับ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกสารหมายเลข ๑

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุวรรณา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	ขนาดแบบรูปและรายการ				จุดเริ่มต้น (กม.) - จุด				ปริมาณงาน	ราคาจ้าง (บาท)	ปริมาณงาน	ราคาจ้าง (บาท)	หน่วย	ราคาจ้าง (บาท)	
		ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม	ราคาจ้าง (บาท)	ราคาจ้าง (บาท)							
1	งานถมดินทาง															
1.1	งานถมดินทางขนาด 0.10 ม. (ขี้เลน)	85,420.00	15.36	1,312,051.20	9,500.00	15.36	-147,456.00	11.09	-133,080.00	92,275.00	1,023,329.75	ตร.ม.	1,164,595.20			
1.2	งานถมดินทางขนาด 0.20 ม. (ขี้เลน)	37,239.00	35.69	1,345,455.11	-4,320.00	35.69	-153,316.80	56.07	-234,148.32	31,631.70	1,773,589.42	ตร.ม.	1,193,138.31			
1.3	งานถมดินทางขนาด 0.50 ม. (ขี้เลน)	55,906.50	35.69	1,994,192.67	-6,480.00	35.69	-229,975.20	228.65	-720,266.71	24,097.74	5,509,947.34	ตร.ม.	1,754,217.47			
2	งานโครงสร้างทางลาดยาง															
2.1	งานดินถม ปรับระดับและบดอัด	104,275.00	11.09	1,156,409.75	-12,000.00	11.09	-133,080.00	228.65	-651,670.56	22,040.86	5,039,642.87	ตร.ม.	6,772,772.70			
2.2	งานชั้นรองพื้นด้วยหินและซีเมนต์บดอัดหนา 0.30 ม.	35,307.70	56.07	2,007,737.74	-4,176.00	56.07	-234,148.32	338.91	-864,248.97	19,983.99	6,772,772.70	ตร.ม.	2,450,502.40			
2.3	งานชั้นรองพื้นด้วยหินและซีเมนต์บดอัดหนา 0.25 ม.	27,247.82	228.65	6,230,214.04	-3,150.08	228.65	-720,266.71	32.32	-310,272.00	75,820.00	15,787,391.00	ตร.ม.	2,550,500.00			
2.4	งานชั้นรองพื้นด้วยหินและซีเมนต์บดอัดหนา 0.25 ม.	24,890.94	228.65	5,691,313.43	-2,850.08	228.65	-651,670.56	255.05	-2,448,480.00	10,000.00	9,682.56	ตร.ม.	165,043.04			
2.5	งานชั้นรองพื้นด้วยหินและซีเมนต์บดอัดหนา 0.25 ม.	22,534.07	338.91	7,637,021.66	-2,500.08	338.91	-864,248.97	255.05	-2,448,480.00	10,000.00	9,682.56	ตร.ม.	165,043.04			
2.6	งาน PRIME COAT (รวมสีทา)	85,420.00	32.32	2,760,774.40	-9,600.00	32.32	-310,272.00	255.05	-2,448,480.00	10,000.00	9,682.56	ตร.ม.	165,043.04			
2.7	งานผิวรอง Asphalt Concrete	75,420.00	255.05	19,235,871.00	-9,600.00	255.05	-2,448,480.00									
2.8	งานผิวรอง Asphalt Concrete	10,000.00	255.05	2,550,500.00		255.05										
3	งานผิวรอง Asphalt Concrete สหภาพเกษตรนิคมหลัก															
3.1	งาน TACK COAT	656.00	14.76	9,682.56		14.76										
3.2	งานผิวรอง Asphalt Concrete	656.00	251.59	165,043.04		251.59										
4	งานทางเชื่อม															
4.1	งานชั้นรองพื้นด้วยหินและซีเมนต์บดอัดหนา 0.20 ม.	80.00	338.91	27,112.80		338.91										
4.2	งาน PRIME COAT (รวมสีทา)	400.00	32.32	12,928.00		32.32										
4.3	งานผิว Asphalt Concrete	400.00	255.05	102,020.00		255.05										
5	งานป้ายจราจร															
5.1	ป้ายจราจรแบบ ป	2.00	4,537.95	9,075.90		4,537.95										
5.2	ป้ายจราจรแบบ U32.33	4.00	2,724.71	10,898.84		2,724.71										
5.3	ป้ายจราจรแบบ ส.ค.บ.ส.ล.11.1.3	14.00	2,889.55	40,453.70		2,889.55										
5.4	ป้ายจราจรแบบ ส.ค.บ.ส.ล.11.1.3	2.00	11,635.77	23,271.54		11,635.77										
5.5	สัญญาณไฟจราจรแบบวงกลม	8.00	13,846.56	110,772.48		13,846.56										
6	เครื่องหนักจราจร															
6.1	ลูกรังขนาด 10 ซม. (ลูกรัง + สีเทา)	4,939.95	281.20	1,389,113.94	-539.85	281.20	-151,805.82									
6.2	ลูกรัง	1.67	281.20	469.60		281.20										
6.3	งาน Rubble Strip	114.23	466.04	50,951.15	-14.70	466.04	-6,556.79									
6.4	หลักรัง	540.00	572.09	308,928.60		572.09										
6.5	ข้อต่อจราจร (ชิ้นเหล็ก)	1.00	4,680.06	4,680.06		4,680.06										
7	งานไฟฟ้าจราจร															
7.1	เสาไฟฟ้า 9.00 ม. หรือใกล้เคียงขนาด 10 ซม.	31.00	9,187.29	284,805.99		9,187.29										
7.2	เสาไฟฟ้า 7.00 ม.	424.00	1,502.95	637,250.80	-35.00	1,502.95	-52,603.25									
				55,100,000.00			-6,103,880.42									
				ราคาต่อสร้งใหม่												
				ราคาต่อสร้งเดิม												
				จำนวน (-)												
				ปรับราคาเป็น												

สัญญาจ้างเลขที่ 22/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)


นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

นาย **สมชาย วัฒนศิริ** (นายช่างก่อสร้าง)

เอกสารหมายเลข ๒


สำเนาถูกต้อง


(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปีงบประมาณ 2565

แบบเลขที่ 10/65

(ขออนุมัติแก้ไขครั้งที่ 1)



โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt concrete

สาย สป.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย

ตำบลหนองโดน-ตำบลดอนทอง-ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน-อำเภอตอนพุด จังหวัดสระบุรี

สำนักงานช่าง

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

[Signature]

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการฯ

นางสรารัตน์ สุขะตัน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

กรรมการฯ

[Signature]

นายสราวุธ อินสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการฯ

[Signature]

นายวรุฒ อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการฯ

[Signature]

นายจิรพล บุญดี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการฯ

นางนงนุชพรหมตา กกริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนงนุชพรหมตา กกริ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการฯ

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

นายพริชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ

นายพริชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วยราคา
1.	งานดินถม	ตร.ม.	75,820.00	ขกอง
1.1	ถมดินถมทรายและหินที่หน้าเดิมลึก 0.30 ม.	ตร.ม.	33,519.00	ขกอง
1.2	ถมดินถมหินที่หน้าเดิม (ดิน-ชุดตัด/วัด/ตัดเลือก ลึก 0.20 ม.)	ตร.ม.	42,428.50	ขกอง
1.3	ถมดินถมหินที่หน้าเดิม (ดิน-ชุดตัด ลึก 0.50 ม.)	ตร.ม.	92,275.00	ขกอง
2.	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร	ตร.ม.	31,631.70	
2.1	งานดินถม ปรับเกลี่ยและบดอัด	ตร.ม.	24,977.74	
2.2	งานปรับหน้าและรองพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 ซม.	ตร.ม.	22,040.36	
2.3	งานวัดตัดเลือก (ลูกรัง) หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	19,983.99	
2.4	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	75,820.00	
2.5	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.25 ม.	ตร.ม.	65,820.00	หน้า 0.05
2.6	งาน PRIME COAT (งานผิวทาง)	ตร.ม.	10,000.00	หน้า 0.05
2.7	งานผิวจราจร Asphalt Concrete	ตร.ม.	656.00	
2.8	งานผิวทาง Asphalt Concrete	ตร.ม.	656.00	
3.	งานผิวจราจร Asphalt Concrete สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	80.00	
3.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	400.00	
3.2	งานผิวจราจร Asphalt Concrete	ตร.ม.	400.00	
4.	งานวางเลือกพื้น	ตร.ม.	400.00	
4.1	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	400.00	
4.2	งาน PRIME COAT (งานผิวทาง)	ตร.ม.	2.00	
4.3	งานผิว Asphalt Concrete	ตร.ม.	8.00	
5.	งานป้ายจราจร	ชุด	4,400.10	
5.1	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1.67	
5.2	ป้ายจราจรแบบ บ.2,3,33	ชุด	99.53	16 ชุด
5.3	ป้ายจราจรแบบ ต.1,ต.๓,๓๑,๓11,๓13	ชุด	540.00	
5.4	ป้ายกำหนดชนิดที่บรพทก	ชุด		
5.5	สัญญาณไฟกะพริบแบบโวลตาเจ	ชุด		
6.	เครื่องหน่วงจราจร	ตร.ม.		
6.1	สีเทอรูมิพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง + สีขาว)	ตร.ม.		
6.2	เส้นหยุด	ตร.ม.		
6.3	งาน Rumble Strip	ตร.ม.		
6.4	หลักนำทาง	หลัก		


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หน่วยราคา
7.	งานป้ายจราจร	ชุด	1.00	
7.1	ป้ายจราจรป้ายเตือน	ชุด		
8.	งานให้ค่า	ชุด	31.00	
8.1	งานรื้อถอนและกำจัดเศษวัสดุและสิ่งกีดขวางที่รื้อถอนแล้ว	ชุด		
	- ปล่อยให้สูง 9.00 ม. พร้อมดินและอุปกรณ์เสริม	ชุด		
	- ปล่อยให้ขุด	ชุด	387.00	

กรณีในสถานที่ก่อสร้างแบบรายการข้างต้น ให้ทำการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete ใต้ความลึกที่เห็นอยู่ในรายละเอียดของผู้ออกแบบ และร้องไปปรึกษาช่างในเบื้องต้นก่อนการก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด




นายสุศักดิ์ สมภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง



นางสุรารัตน์ สุขะระตัน
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา



นายสรวิทย์ อินสุ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง



นายสุรตอยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล



นายจิรพล บุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขุโนค



นายพงษ์กร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ



นายพรชัย แก้วบ้าน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)



สำเนาถูกต้อง

(ในนามกรรมการสภา กษ.)
นายกกรรมการสภาโยธา

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ควบคุมงาน

ควบคุมงาน

ควบคุมงาน


ควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต Asphalt concrete

สาย กม.ที่ 1+0037 บ้านหนองโสน - บ้านหนองทราย

ลักษณะของโบน-ส่วนลาดยาง 1 ด้านไหล่ขวา อำเภอนากลาง จังหวัดสระบุรี

ขทางที่ 2 กม.ที่ 5+000 ถึง กม.ที่ 9+975 และ กม.ที่ 11+575 ถึง กม.ที่ 12+600 (เริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 9+975 ถึง กม.ที่ 11+575)

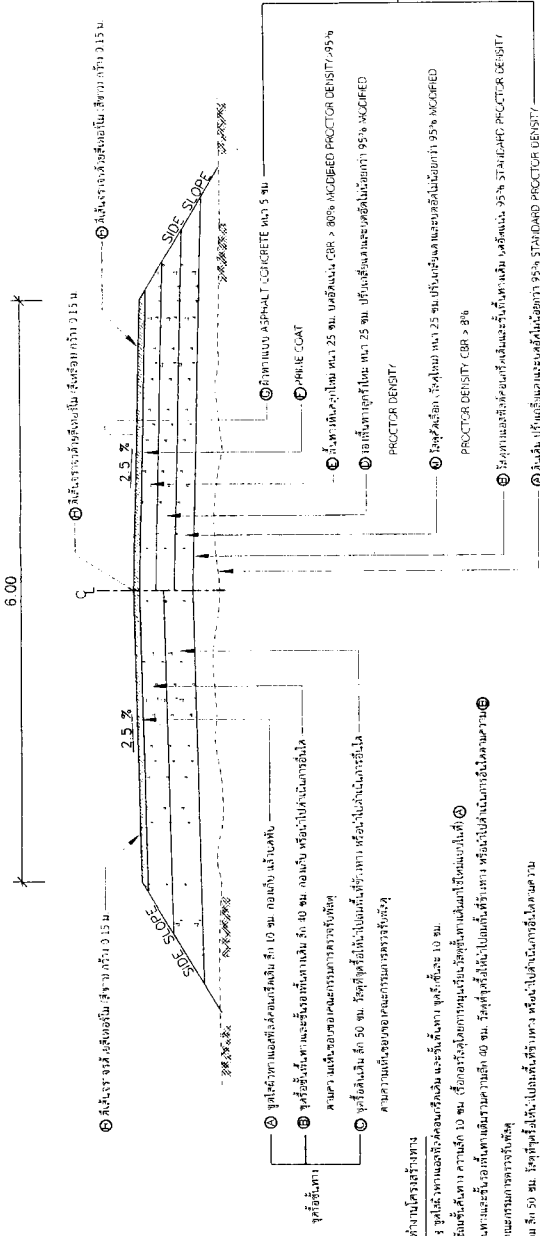

รูปตัดตามขวาง ASPHALT CONCRETE

ข้อกำหนดการดำเนินงานก่อสร้าง

1. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑
2. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
3. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
4. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
5. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
6. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
7. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
8. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
9. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
10. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒
11. วัสดุที่ใช้สำหรับผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และชั้นผิวหน้า จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแปลนที่ ๑ และ ๒

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการฯ

นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการฯ

นายสุชาติ อิมสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการฯ

นายวรุตต์ อยู่นันท์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการฯ

นายจิรพล บุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการฯ

สำนักงานท้องถิ่น
นางสาวสุวรรณา ภาศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการฯ

ความคุมงาน

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ความคุมงาน

นายพชัย แก้วปั้ง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช)

ความคุมงาน

ความคุมงาน

ความคุมงาน

ความคุมงาน



ความคุมงาน

แผนผังแบบแก้ไข.....หน้า.....

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)


สาย สป.ถ1-0037 บ.หนองโดน-บ.ทองย้อย

ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ไผ่ลือ อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

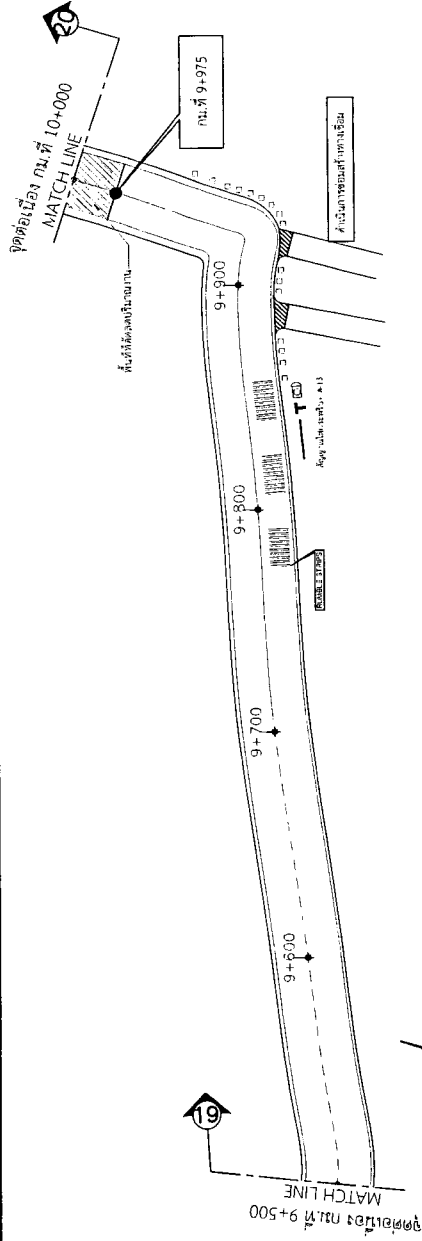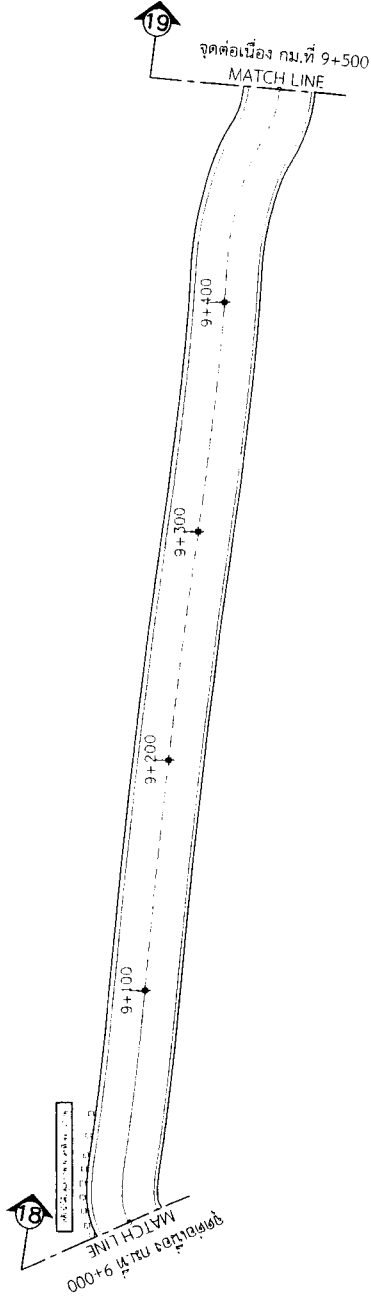


ส่วนราชการที่
(นางสาวสุวรรณา ภักดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด



นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ประธานกรรมการฯ



นางสรวิรัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

✓


กรรมการฯ


นายสรวิทย์ อินสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง


กรรมการฯ


นายวรุตย์พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล


กรรมการฯ


นายจิรพล บุณดี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค


กรรมการฯ


นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ความหมาย


นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ความหมาย


นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช)



ความหมาย


นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สป.ถ1-0037 บ.หนองโตน-บ.ทองย้อย


ต.หนองโตน-ดอนทอง-ต.ไผ่หลวง อ.หนองโตน-อ.ดอนทวด จ.สระบุรี

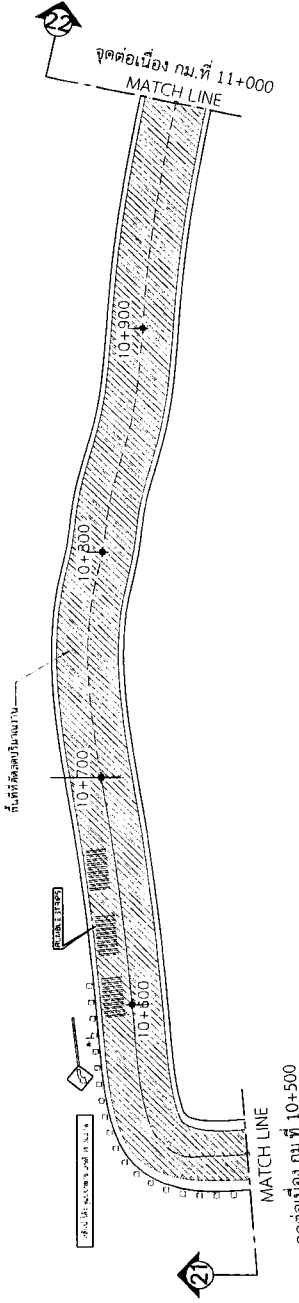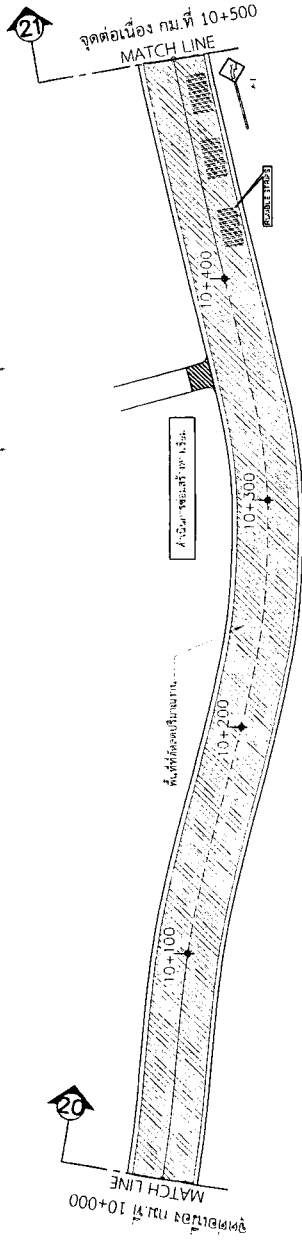


ส่วนอุกสียง

(นางสาวสุรารัตน์ กาวี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด


นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการสำนักงานกช่าง


ประธานกรรมการฯ


นางสรวิตรี สุขะเมตัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา


กรรมการฯ


นายสรวิชัย อินสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการฯ



นายวรุฒม์ อยู่พันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการฯ



นายจิรพล บุญดี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการฯ

ควบคุมงาน


นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ



ควบคุมงาน


นายพรชัย แก้วบังวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สป.ถ1-0037 บ.หนองโตน-บ.ทองน้อย

ต.หนองโตน-ต.ดอนทอง อ.ไผ่หลวง อ.หนองโตน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

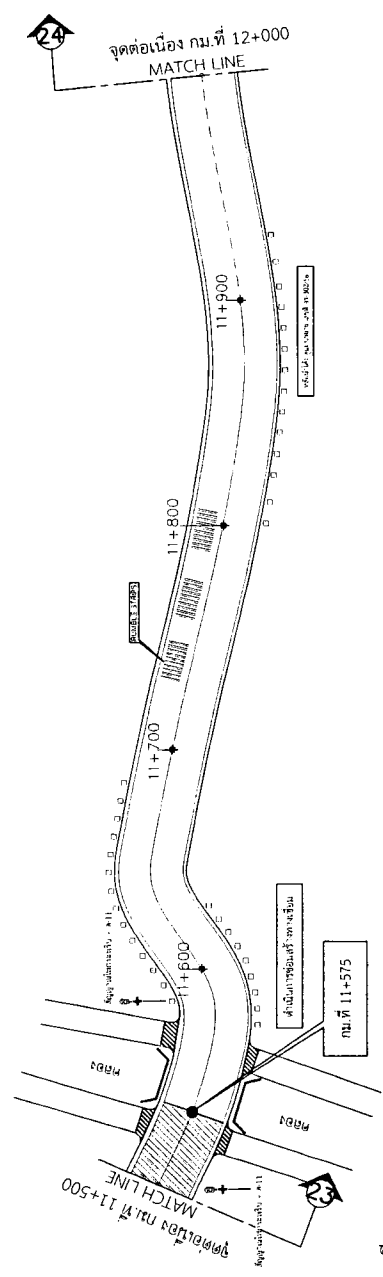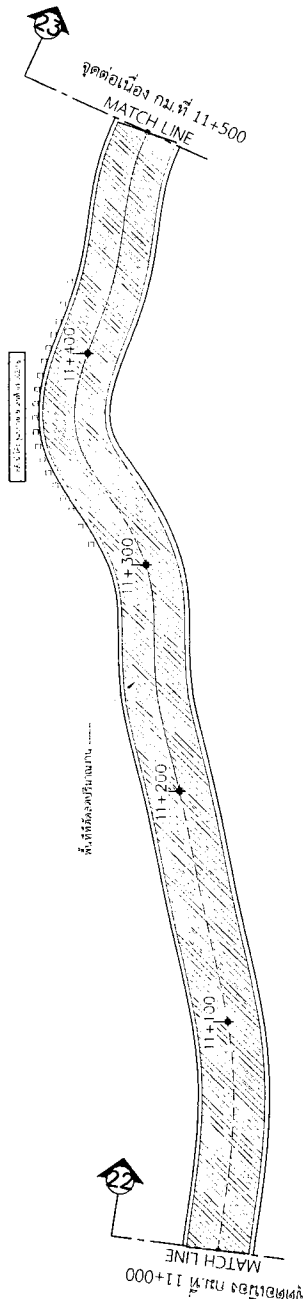

สำนักงานผู้รับจ้าง
(นางสาวสุวิมล สท.)
หัวหน้ากองพัสดุพัสดุภัณฑ์

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

[Signature]
นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานกรรมการฯ
นางสรวิมล สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

[Signature]
นายสุรศักดิ์ อึ้งสุข
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

[Signature]
นายวรุต อยู่มพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการฯ
นายจิรพล บุณเดื่อ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการฯ
นายพรชัย แก้วบัววัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ
นายพรชัย เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ
นายพรชัย แก้วบัววัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ
นายพรชัย แก้วบัววัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ
นายพรชัย แก้วบัววัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

กรรมการฯ
นายพรชัย แก้วบัววัน
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

เอกสารหมายเลข ๓

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ ๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ช่วงที่ ๑ งานดินคันทาง ประกอบด้วย

- งานขุดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์เดิม (แล้วเสร็จ)

- งานตัด - ขุดรื้อชั้นทางเดิม (แล้วเสร็จ)

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพร้อมจัดทำ Profile และ Crosssection แล้วเสร็จ

- งานวัสดุทางเดิม, งานวัสดุคัดเลือก, งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง, งานพื้นทางปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด (แล้วเสร็จ)

- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ช่วงที่ ๒ งานดินคันทาง ประกอบด้วย

- งานขุดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์เดิม (แล้วเสร็จ)

- งานตัด - ขุดรื้อชั้นทางเดิม (แล้วเสร็จ)

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานดินเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพร้อมจัดทำ Profile และ Crosssection (แล้วเสร็จ)

- งานวัสดุทางเดิม, งานวัสดุคัดเลือก, งานวัสดุชั้นรองพื้นทาง, งานพื้นทางปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด (แล้วเสร็จ)

- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙,๘๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๑ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

- งานวัสดุทางเชื่อม, งาน Prime Coat, งาน Tack Coat, งาน Asphalt concrete

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
ช่วงที่ ๒ งานผิวทางและงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง (แล้วเสร็จ)

- งานวัสดุทางเชื่อม, งาน Prime Coat, งาน Tack Coat, งาน Asphalt concrete

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๕๐,๓๑๙.๕๙ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒ งานอื่นๆ ประกอบด้วย

- งานป้ายจราจร (แล้วเสร็จ)

- งานสีตีเส้นจราจร, งานเครื่องหมายจราจร, หลัคนำโค้ง(แล้วเสร็จ)

- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าเดิม(แล้วเสร็จ)

- ป้ายโครงการและงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างโดยให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ตรวจรับไว้

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุรธนา ภาชี)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ
