

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วราณุ พลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๔๘๙ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๘/๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง สารคาม อำเภอ/เขต พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี โดยนายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทาง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมิ หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๓๗๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๕ ต.ลำพญา ล.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๕ ต.ลำพญา ล.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตำบล/แขวง ลำพญา อำเภอ/เขต มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราณุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทาง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาจัดการค้าร่วม จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้เป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสุธรรมหด สาขาบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๒๘๗๓๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๔,๑๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหلاลักษณะ ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๒๘,๖๖๓.๕๕ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยหก

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะรัง

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้าทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



(นางสาวอัมพร ประชาน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวม เป็นเงินเท่าๆ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ชื่อกิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดชั้นดาด้วย

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๗,๑๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์, ปรับเกลี่ย, บดอัดคันทางเดิม พร้อมลงวัสดุชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัด
แน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๔๐,๗๑๕.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานเพิ่มราจรคอนกรีต, ตัดรอยต่อพร้อมขยาย, ลงวัสดุปิดขอบทางทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสายทาง
- งานที่เส้นระบายน้ำ งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ - เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชื่อกิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด อนรา ๘๘๘

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๑๙๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์, ปรับเกลี่ย, บดอัดคันทางเดิม พร้อมลงวัสดุชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้ว
เสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๓๘,๙๙๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเพิ่มราจรคอนกรีต, ตัดรอยต่อพร้อมขยาย, ลงวัสดุปิดขอบทางทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย
ทาง - งานที่เส้นระบายน้ำ งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ - เก็บทำความสะอาดบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อสร้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๕

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เดือนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูมย์)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เขาลำทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ (พนักงานอัยการ ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจังหวัดเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัดหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังหวัดอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจังหวัดจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังหวัดเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังหวัดจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักดิใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักดิใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจังหวัด ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัด

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจังหวัดจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังหวัดได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังหวัดจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจังหวัดเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังหวัดจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีคอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังหวัดในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจังหวัด

(นายเรืองศักดิ์ วราภูณย์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบวี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายวิรุฬห์ เขาถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



ธ.๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจังหวัด ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้าทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง

สำเนา



ผู้รับจ้าง

สำเนา

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนา

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่น วันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมมจะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยข้อมูลนี้ให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้เหมือนเดิมค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างต้องกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีข้ารุदบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าหดแทนนี้ได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพิพัฒนาที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง ส้านาคูกต้อง

(นายวิรุฬห์ เขาถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูณ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปภูบดินทร์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เขาถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

๐๒/๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญาี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดหอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามคำสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ขึ้นได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน

สามสิบวัน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)
(นางสาวอัมพร ประชาน)

ผู้รับมอบอำนาจ



กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ทรัพย์ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันนั้นได้ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจัง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เขาถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

๑๒๗

(นางสาวอัมพร ประชาน)

และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบัญชีงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภาระดังครบทั้งดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีคุณภาพระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณภาพระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้เข้าสัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูน)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัญบตหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง) สายงานคุ้มครองผู้รับมอบอำนาจ

๐๒๖๘

(นางสาวอัมพร ประชาน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 * It/Io + 0.40 * Et/Eo + 0.20 * Ft / Fo$$

$$K_{3.4} = 0.30 + 0.10 * It/Io + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข昶าทอง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางพจน์ย์ ทับเจิน)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๐๖๐๓๗๙

เลขคุณสัญญา ๖๒๑๐๒๒๐๐๕๔๘๔

สำเนาถูกต้อง

พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๖๒๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๕ ต.ลำพญากลาง อ.มหา均衡 จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๕ ต.ลำพญากลาง อ.มหา均衡 จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๕ ต.ลำพญากลาง อ.มหา均衡 จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสรารัตน์ สุขุมดัน

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๒. นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นางวาสนา ศรีป่าวิทย์

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อำนวยและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสราวุธ อินสุข

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายมารุต ชาวสาน

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นายสมโภชน์ กลมปล้อง

กรรมการ

นายช่างโยธาอาชุโส

สำเนาถูกต้อง

อ.วัน

(นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Tor

๔. นายภูริทัต กิจเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๕. นายดนัย ศิริ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
อำนาจและหน้าที่

กรรมการ

ตรวจการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

ผู้ควบคุมงาน

๖. นายพรชัย แก้วปั้งวัน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

๗. นายทศพล พรคงวนิว
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

๘. นายบรรจง ปืนสุวรรณ
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรืองศักดิ์ วรหาญ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการรองนายกองค์การ.....
.....ปลัดองค์กร.....
.....รองปลัดองค์กร.....
.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....
.....หัวหน้าฝ่าย.....
.....เจ้าหน้าที่ พิรุพร/ฯฯ.....
..... อธิบดี.....

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ หน้า

ลงชื่อ.....*A* ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....*B* ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....*C* พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*D* พยาน


(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

D พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



សាស្ត្រធម៌ សាស្ត្រធម៌




ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

卷之三

卷之三

NO SACLE



លំពីថ្ងៃទាំងមួយ	ការប្រើប្រាស់សាខាទុកដាក់	សាខាទុកដាក់	សាខាទុកដាក់
1.	ការប្រើប្រាស់សាខាទុកដាក់	1	អេឡិចត្រូនិក
2.	ប្រើប្រាស់សាខាទុកដាក់	2	អេឡិចត្រូនិក
3.	ប្រើប្រាស់សាខាទុកដាក់	3	អេឡិចត្រូនិក
4.	ប្រើប្រាស់សាខាទុកដាក់	4-10	អេឡិចត្រូនិក

คณิตครูภารกิจชั้นปีที่ ๑๖๘ / ๒๕๖๑
ตามที่ได้รับ ใบอนุญาต ที่ ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย บ้านเรียน ๑๖๘/๑

การค้าระหว่างประเทศ
การค้าภายในประเทศ

નગરપાલી

Digitized by srujanika@gmail.com

1

၁၃၁

ລົດຕະຫຼາດ	ວຸງຍາກສ	ພັນຍາ	ເສີມພາການ	ຮມມາແຫຼ່ງ
1.	ຈານດີຕິມົງການ			
1.1	ຈານເປົ້າຢູ່ແບ່ງເສື່ອມືກແລະ ປົດຕົວກຳນົກຈົ້າ	ຕົກ. ໧. ໧	33,741	
2.	ຈານໂຄງຮັດສົງການ ແລະ ອົງຈາກ			
2.1	ຈານເຊັ່ນອົງທຶນຕົມນົມກິດ (ສູງສົງ)	ຕົກ.ນ	4,939	
2.2	ກວາຍອອົ່ນໜາ 0.05 ມ ພ້ອມເຫຼື່ອເສົ່າ	ຕົກ.ນ	1,467	
2.3	ຜົາທາງໂຄງຮັດສົງມືກຕົມນົມກິດ ແນ 0.15 ມ (240 ksc.)	ຕົກ.ນ	29,340	
2.4	ເຫັນກ DB 12 ມມ (DOWEL BAR)	ຕົກ.ນ	4,34	
2.5	ເຫັນກ DB 12 ມມ (TE BAR)	ຕົກ.ນ	4,34	
2.6	ກະຕະກາງການເຊື້ອຍ	ແມັນ	5	
2.7	ຄ່າເອົາສົ່ງເສົ່າມາຫຍາຍ	ຕົກ.ນ	1.56	
2.8	ຄ່າຕັດຄະຍຸບຂອງຄານກິດແລະ ຂະຫຍາຍາງ	ມ	9,780	
2.8	ຈານປົດໜ້າກາງກອນໄສເຫັນ ຫົດສູງເງົາ	ຕົກ.ນ	167	
3.	ສານງົງກົງຈົກ	ໆດຸດ	1.00	
3.1	ປາຍຈາກແມ 1.33	ໆດຸດ	-	
3.2	ໄຟກອງກະບືໄປກົດເສົ່າ	ຕົກ.ນ	1,100.25	
3.3	ຈານຕື່ສົ່ນຈົກຈະນີອິນ-ຫາກ	ຕົກ.ນ		
4.	ຈານທອງກະປາຍໃນ	ທອກ	-	
4.1	ໝາເດີ @ 0.80 @ 1.00 ມ			
5.	ໄປຍໂຄງກາງ (ປໍ່ມະນີ)	ໆດຸດ	1	
5.1				

ສະຫຼຸບມືນຕະຫຼາດ ດ້ວຍລົງຈາກເອົາຮັກ ເຊິ່ງ ແລະ ໄກສະໜັກ
ໄກສະໜັກ ແລະ ຖະຍາຍ ສຳນາງວຸງ ໂດຍ

.....ພາຍໃນ
ຕິດຕະຫຼອງ.....


คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	แบบประเมินทักษะภาษาไทย
ตามคู่มือ อ่านแล้ว พี่... ชีวิต / 2561	นักเรียนพิจารณา
26 ธันวาคม 2561	ผู้สอนพิจารณา
๙๖๒๕๓	ผู้ดูแลระบบ
 ลายเซ็นของนักเรียน	
 ลายเซ็นของครู	
 ลายเซ็นของผู้ดูแล	

ପାଦବୀ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପାଇଁ

三
四


卷之三

 นายกรัฐมนตรี	 นายกรัฐมนตรี	 นายกรัฐมนตรี

แบบรากฐานโครงสร้าง




จุดตั้งต้นโครงสร้าง
ด้านที่ 0+000
N=14.906478
E=101.411291

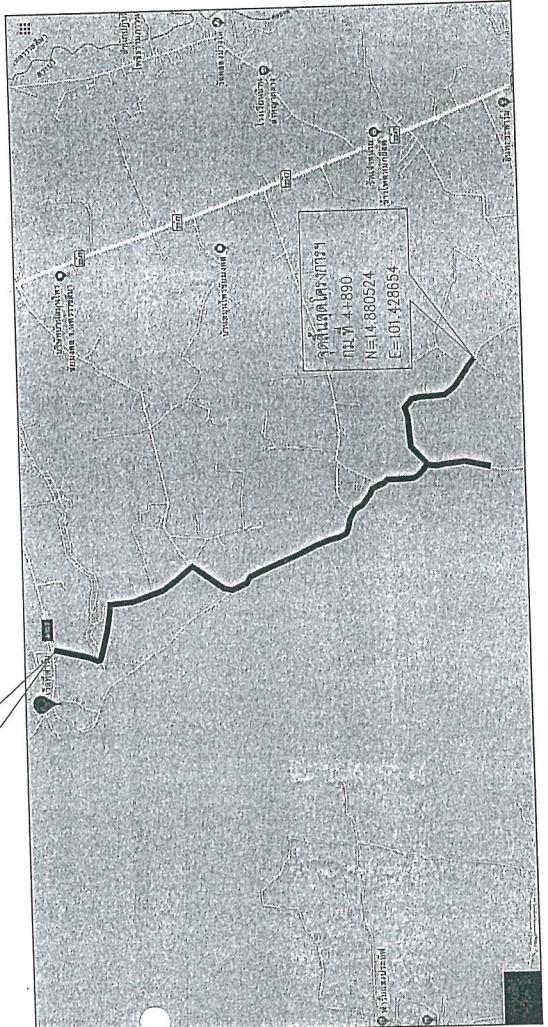

โครงสร้าง
ด้านที่ 3-5 ลักษณะของฐานราก
ก่อสร้างโดยการซึมซึบดินราก
ฐานหินกรวดขนาด 6.00 m x กว้างหน้ากว้าง 4.890 m

(ค่าความกว้างของฐาน 3.9 ล้านเมตร)

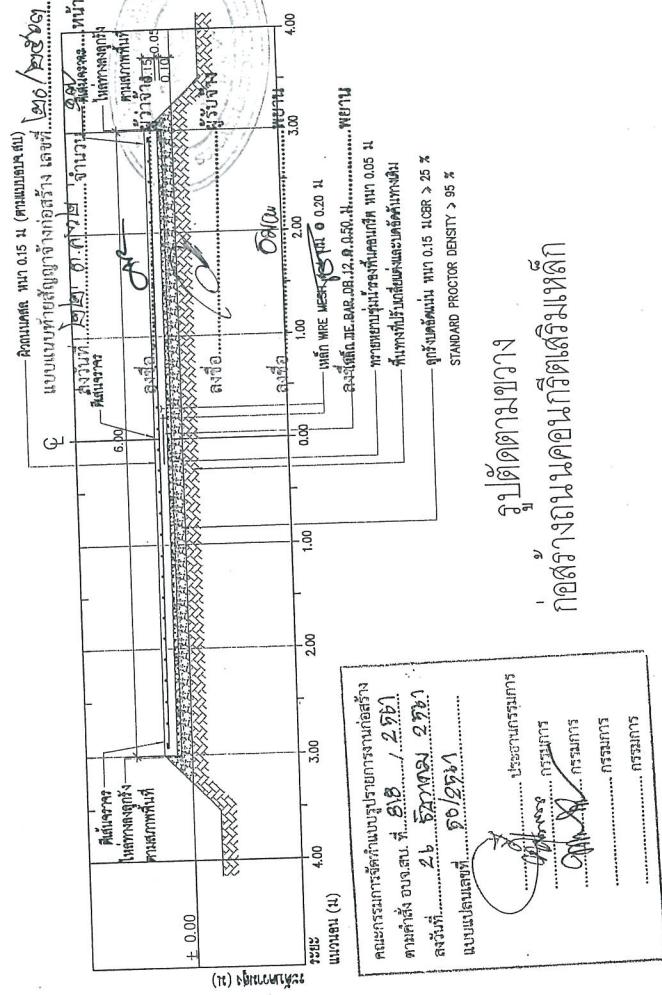

- หมายเหตุ**
- จุดตั้งต้น - จุดตั้งต้นโครงสร้าง และป้ายแสดงที่ทาง 0.00 เป็นที่อยู่ของแกนตัวอักษรที่ทาง 0.00 ตามที่แนบมา
 - กองต์เรนในงานก่อสร้างที่ต้องการนำไปรื้อถอนในภายหลัง หรือต้องการถอดออก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง 0.00 ทันท่วงทัน
 - กองต์เรนที่ติดต่อกันและจะต้องถอดออก ท่าน 25.00 m ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง 0.00 ทันท่วงทัน
 - ภาระที่ต้องรับรู้ของโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักตัน 29.340 ตัน/m³ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง 0.00 ทันท่วงทัน
 - เท้ารากต้องมีแนวตั้งต่อตัวอย่างต่อเนื่องทุกที่

โครงสร้าง
ด้านที่ 3-5 ลักษณะของฐานราก
ก่อสร้างโดยการซึมซึบดินราก
ฐานหินกรวดขนาด 6.00 m x กว้างหน้ากว้าง 4.890 m น้ำหนักตัน 29.340 ตัน/m³

ผู้ออกแบบ	นางสาว สุรดา ใจดี	ผู้ออกแบบที่ได้รับอนุมัติ หน้าที่ 3-5 ลักษณะของฐานราก 0.00-4.00 m	ผู้ออกแบบ ใจดี	ผู้ออกแบบ ใจดี
ผู้ตรวจสอบ	นางสาว สุรดา ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี
ผู้ตรวจสอบ	นางสาว สุรดา ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี
ผู้ตรวจสอบ	นางสาว สุรดา ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี	ผู้ตรวจสอบ ใจดี

ลงนามยืนยัน

3

၁၂။ မြန်မာတို့၏ အမျိုးသမီးများ၊ ၁၃။ မြန်မာတို့၏ အမျိုးသမီးများ

४१

କାନ୍ଦିଲା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା
କାନ୍ଦିଲା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା

ต่างกัน
ต่างกัน

..... หมายเหตุ
..... หมายเหตุ

25

၁၂-၃၃

100

บุตรรัตน์พัชรินทร์
ภัย ที่ 0-000
N=14306478
E=101.411291

Technical drawing of a road network showing three main roads labeled "กูเป็นทาง" (Koo Phen Ong) meeting at a junction. The roads are numbered 0+200, 0+300, and 0+400. A dashed line indicates a proposed or alternative route.

คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์
ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ ยุบเรื่อง เรื่อง 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น เส้นที่ 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น	คณิตศาสตร์ ยุบเรื่อง เรื่อง 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น เส้นที่ 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น	คณิตศาสตร์ ยุบเรื่อง เรื่อง 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น เส้นที่ 2.6 ที่จุดตัดกันของ 2 เส้น
แบบฝึกหัดที่ 2.6	แบบฝึกหัดที่ 2.6	แบบฝึกหัดที่ 2.6



ຮູບພາຍໃນມະນາດ ສະຫງົບຜູ້ອ່ານວິຊາ ເລື່ອງ ແລະ ເລື່ອງ
ຄະນຸນີ້.....ອັນ ຕະຫຼາມ.....ຈຳການ ອົບ.....ພໍາ



คณิตเรียนรู้ที่ ๑๔ แบบประเมินทักษะการคำนวณและการอ่านตัวเลข
แบบประเมิน ชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ ๒ กศธ ๒๕๖๑

សំណង់

សំណើរាយ		ក្រសួងសាធារណការពេជ្ជនគរ៉ែនកម្ពុជា អង្គភាព ៣-៥ នគរបាលភ្នំពេញ នគរបាល ១ សង្កាត់		សំណើរាយ ក្រសួងសាធារណការពេជ្ជនគរ៉ែនកម្ពុជា អង្គភាព ៣-៥ នគរបាលភ្នំពេញ នគរបាល ១ សង្កាត់	
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ	ឈ្មោះ
លោកសារ	លោកសារ	លោកសារ លោកសារ	លោកសារ លោកសារ	លោកសារ លោកសារ	លោកសារ លោកសារ
សំណើរាយ	សំណើរាយ	សំណើរាយ សំណើរាយ	សំណើរាយ សំណើរាយ	សំណើរាយ សំណើរាយ	សំណើរាយ សំណើរាយ
និយោបាយ	និយោបាយ	និយោបាយ និយោបាយ	និយោបាយ និយោបាយ	និយោបាយ និយោបាយ	និយោបាយ និយោបាយ
អ្នក	អ្នក	អ្នក និយោបាយ	អ្នក និយោបាយ	អ្នក និយោបាយ	អ្នក និយោបាយ
	/...../...../...../...../...../...../...../.....

၁၅၂၁

卷之三

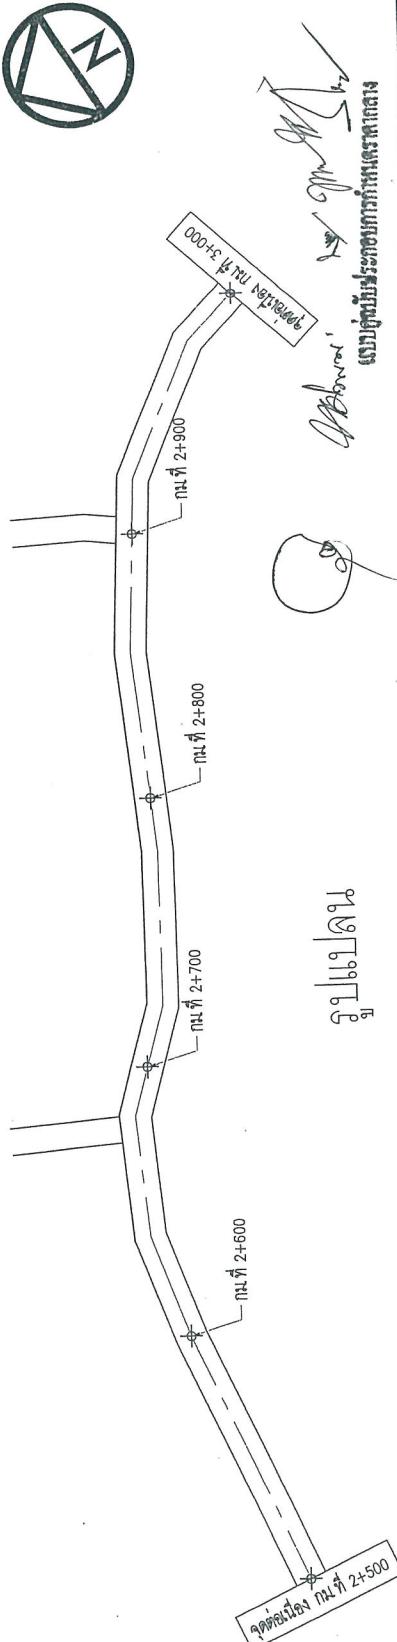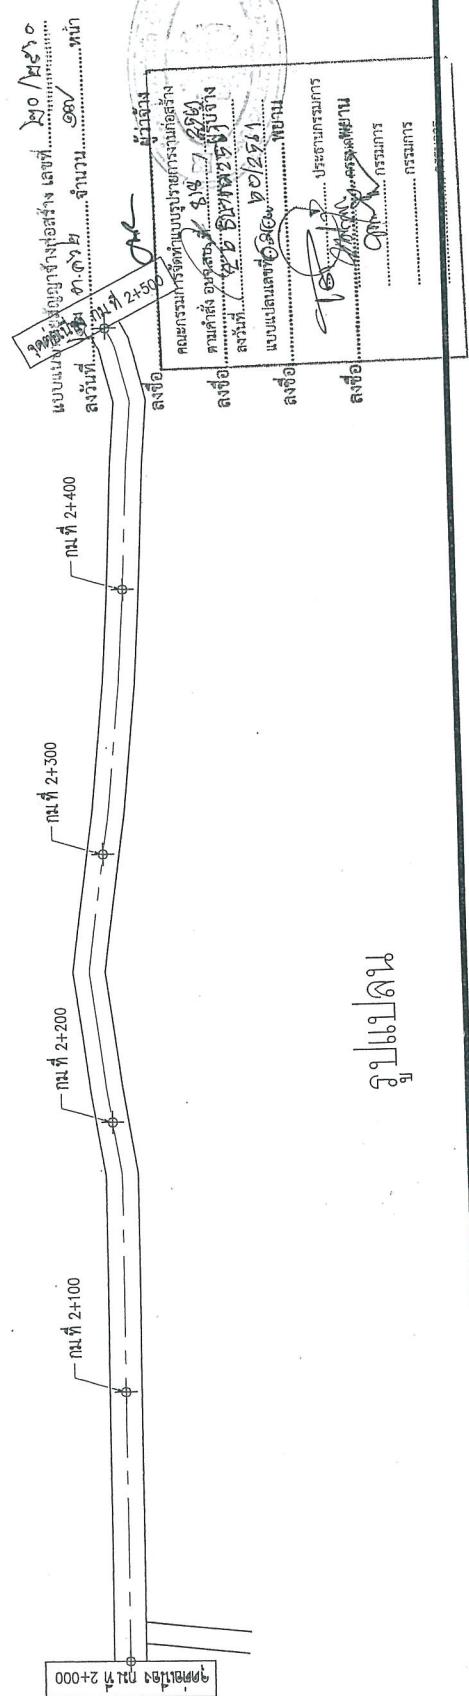

ပုဂ္ဂနိုင်မြေအနေဖြင့်ပေါ်လေရှိနေသော်လည်းကောင်း၊

กษัตริย์ทรงนับถือพระราชาจักรีเป็นมากที่สุด

“ร่างถนนคน行ก็ต้องมีเส้น

..... หน้า ก้าวเดิน จักรยาน ก้าวเดิน หน้า

३८

กิตติมศักดิ์ 500

วันที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	ผู้รับ	ผู้จ่าย
20/09/2561	850	ค่าเชื้อเพลิง ช่างแม่บ้าน	ช่างแม่บ้าน	กานต์
21/09/2561	2561	ค่าเชื้อเพลิง ช่างแม่บ้าน	ช่างแม่บ้าน	กานต์
20/09/2561	850	ค่าเชื้อเพลิง ช่างแม่บ้าน	ช่างแม่บ้าน	กานต์

3+500
RIL N 3491
PHOTOGRAPH

...
...
...

၁၃၅

N

44
John J.

三



— เออกสารแนบท้ายสัญญาซื้อที่ เก้า พ.ป.ว.๒๕๖๗

四百一

၁၃၈

๑๖๙

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ରୀ ୩-୫ ମହିନେରେ କେବଳମାତ୍ରାଙ୍କ ଉପରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି

1

1



..... សំគាល់ជូនដី និង សំគាល់ជូន និង សំគាល់ជូន និង សំគាល់ជូន

ເຫັນ TIE BAR DB 12 @ 0.50 m.
ເອກສາງແນບຫ້າຍສຶກພາຫຼັກຊີ້ວ່າ.

มาตรฐานของหินทรายที่ใช้ปรับระดับหนา 0.05 ม. —————
มาตรฐานของหินทรายที่ 2.40 ksc. (ตามยานยนต์กระสอบแมง)—————
มาตรฐานของหินทรายที่ 0.15 CBR มากกว่าการตรวจสอบ 25 %
STANDARD PROCTOR DENSITY มากกว่าร้อยละ 95 %

- CONTRACTION JOINT
- เหล็ก DOWEL RB Ø 12 มม.
- LONGITUDINAL JOINT

อะลีก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ย. —

卷之三

The figure shows a rectangular frame divided into a grid. The width of the frame is labeled as L at the top center. The height of the frame is labeled as 6.00 on the right side. A diagonal line from the bottom-left corner to the top-right corner is drawn. Horizontal and vertical grid lines are present, creating a pattern of small squares across the entire area. The grid lines are spaced evenly, dividing the frame into a 10x10 grid of smaller rectangles.

ပြုလေသံများအတွက်

เส้นไฟฟ้าหัวต่อร้อนค่าแรงงานต่อชั่วโมง @ 0.02 บ./ช.
เหล็ก DOWEL RB Ø 12 mm. @ 0.50 บ.
ปลอกเชือกหัวน้ำและท่อต่างๆ

EXPANSION JOINT

Georgian Society of America 44

The drawing shows a rectangular base plate with a thickness of 0.05. A central slot has a width of 0.10 and a depth of 0.08. The top edge features a U-shaped cutout with a height of 0.08. Material specifications include 'RB Ø 6 ү' and 'Чугун чугун 2'. A note at the bottom left indicates 'RB 12 6 ү' and 'Чугун чугун 2 ү'.

11

၁၂၈

卷之三

รายงานการศึกษาทางการค้าระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กิตติมศักดิ์

卷之三

ເມືດຕະກຳທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢູ່ອັນດຸບຕະຫຼາດ


ស្រុកការពាណិជ្ជកម្ម

- ต้องมีระยะเวลาในการรอที่มากกว่า 1,000นาที ให้ผลลัพธ์ของแต่ละ 100 แมรค์
- 5. ก่อนดำเนินการซ้อมร่าง ผู้รักษาความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในร่างนั้นๆ สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ
- 6. แนะนำ รับบัน ผู้รักษาความปลอดภัยจะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในร่างนั้นๆ สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ


卷之三

CHIEN LIN HUANG

卷之三

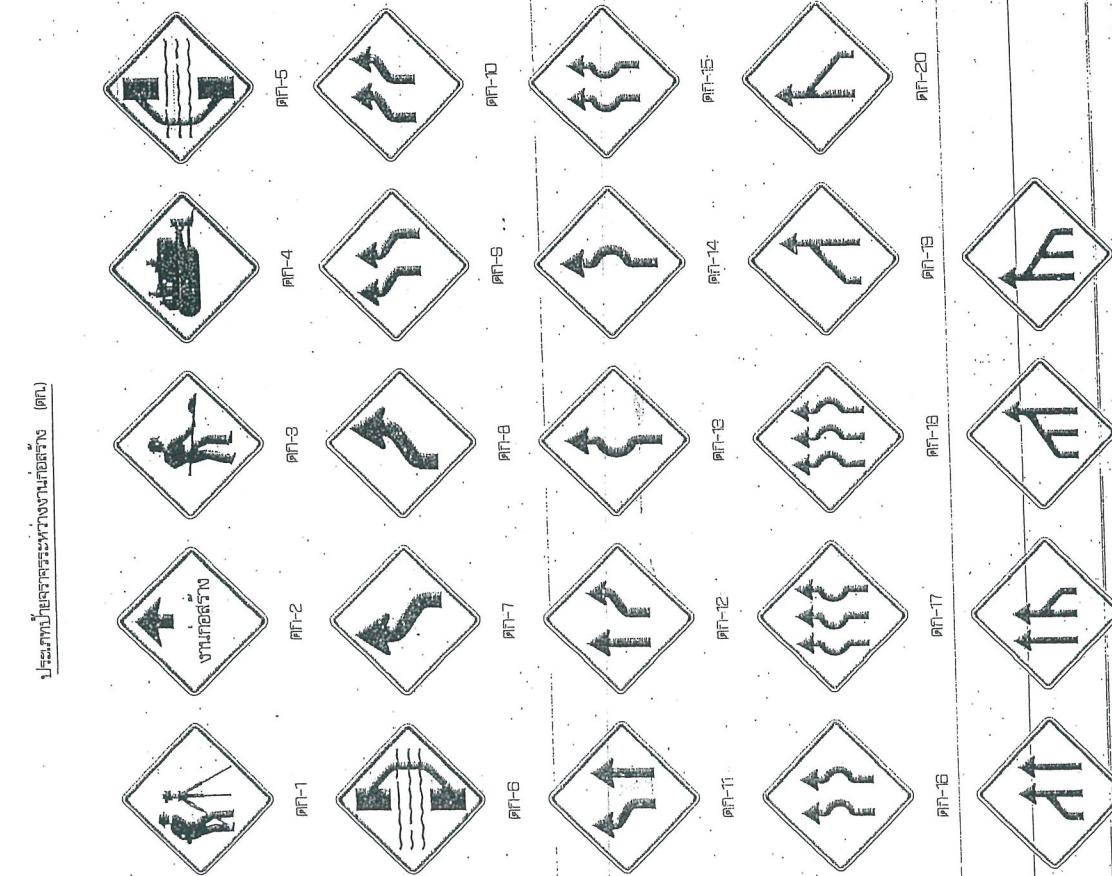

รายการเครื่อง械ที่บัญชีรายการเครื่อง械ทางานพาณิชย์	
รายการที่	รายการเครื่อง械
1.	เครื่องจักรกล
2.	เครื่องจักรกล
3.	เครื่องจักรกล
4.	เครื่องจักรกล
5.	เครื่องจักรกล
6.	เครื่องจักรกล
7-24.	เครื่องจักรกล
25-26.	เครื่องจักรกล

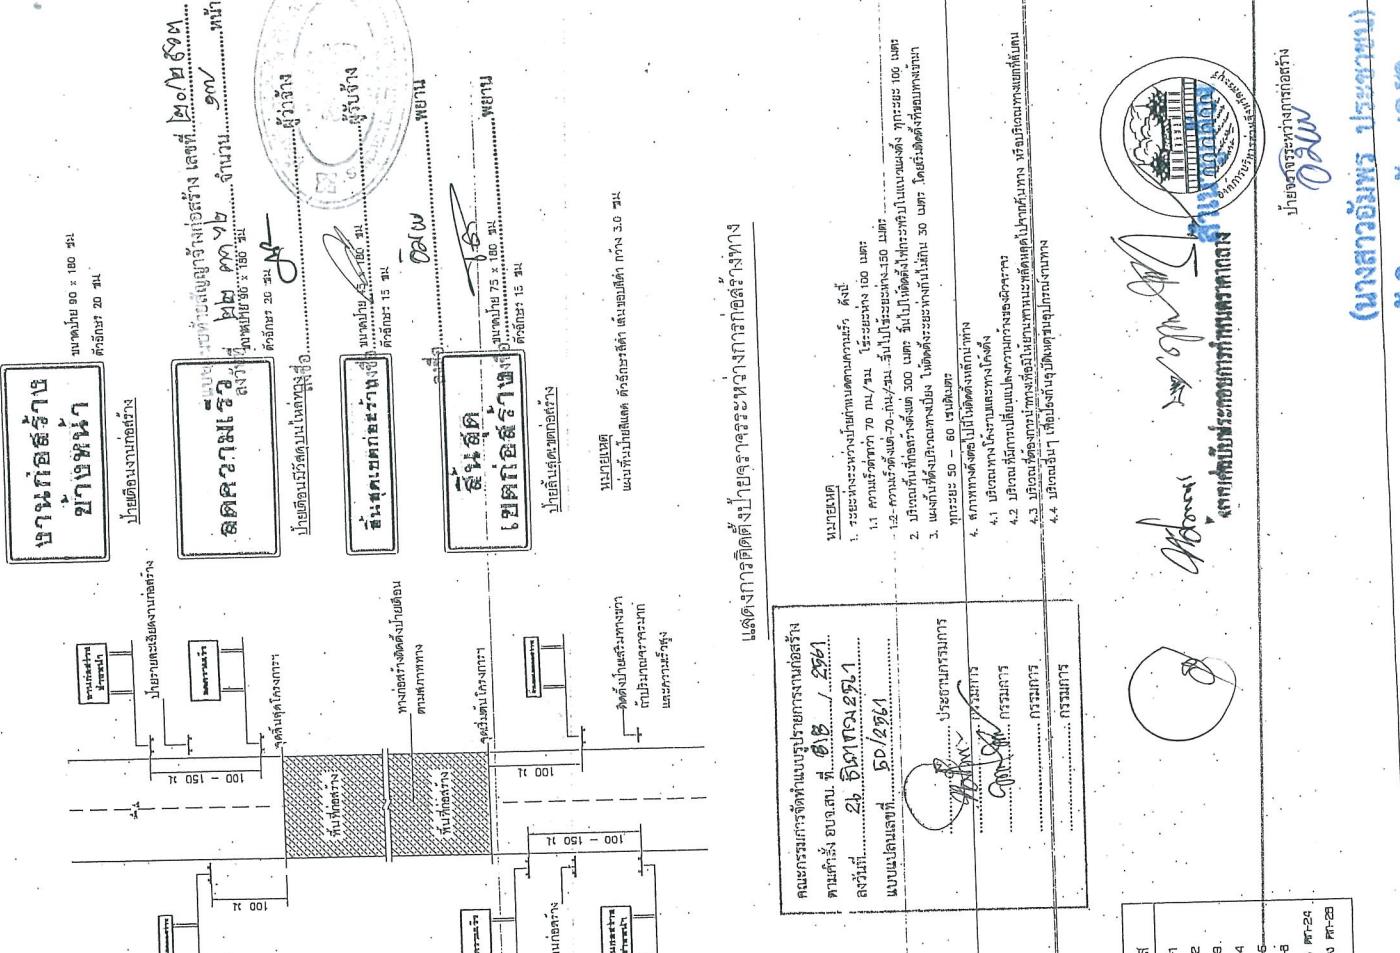

หนังสือราชการ ๑๔๖๘

นายวิษัย พูนพิริยะ

นายวิษัย พูนพิริยะ

หนังสือราชการ ๑๔๖๘

THE JOURNAL OF CLIMATE

100

0.50 1 . 1.50

三

0.75

1/28/0

۱۰۱

गणितज्ञान

卷之三

ແພັນດີເມືອງ

卷之三

111

๑. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๑ ของสถานศึกษา ๒. แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๒ ของสถานศึกษา ๓. แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๓ ของสถานศึกษา ๔. บริษัทฯได้รับมอบหมายให้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ศึกษาธิการและนักเรียนของสถาบันฯ ให้ได้ ๕. ผู้ประเมินต้องตรวจสอบ แผนผังห้องเรียนของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ และตรวจสอบว่าห้องเรียนของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ของสถาบันฯ ที่ผ่านมา ไม่ชำรุดเสื่อมโทรม ๖. ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่าห้องเรียนของสถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ไม่ชำรุดเสื่อมโทรม ๗. ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่าห้องเรียนของสถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ของสถาบันฯ ที่ผ่านมา ไม่ชำรุดเสื่อมโทรม ๘. ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่าห้องเรียนของสถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ของสถาบันฯ ที่ผ่านมา ไม่ชำรุดเสื่อมโทรม ๙. ผู้ประเมินต้องตรวจสอบว่าห้องเรียนของสถาบันฯ ที่ได้รับอนุมัติคุณวุฒิ ของสถาบันฯ ที่ผ่านมา ไม่ชำรุดเสื่อมโทรม ๑๐. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๑ ของสถานศึกษา แบบ ๒ ของสถานศึกษา แบบ ๓ ของสถานศึกษา แบบ ๔ ของสถานศึกษา ๑๑. แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๑ ของสถานศึกษา แบบ ๒ ของสถานศึกษา แบบ ๓ ของสถานศึกษา แบบ ๔ ของสถานศึกษา ๑๒. แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๑ ของสถานศึกษา แบบ ๒ ของสถานศึกษา แบบ ๓ ของสถานศึกษา แบบ ๔ ของสถานศึกษา ๑๓. แบบฟอร์มประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา แบบ ๑ ของสถานศึกษา แบบ ๒ ของสถานศึกษา แบบ ๓ ของสถานศึกษา แบบ ๔ ของสถานศึกษา

A technical drawing of a stepped base plate. The plate has a total width of 1 unit, divided into three segments of 1/2 unit each. The left segment is hatched with diagonal lines. The middle segment has a height of 0.10 units. The right segment is also hatched with diagonal lines. A vertical dimension line indicates a height of 1/2 unit from the bottom of the middle segment to the top of the right segment.

1

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภูณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เขาก้าทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจน์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

๐๒๘

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ 888 โดย นายปกาศิต หลาภ สุขุม ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทั้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓-๔ ต.ลำพญากลาง อ.มหา均衡 จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ในแจ้งปีมานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอที่ยื่น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากำไรสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีที่ใช้ค่าเสียหายที่ได้มา แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕.๓
ดำเนินการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สำหรับ การดำเนินการที่ได้รับ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค่าใช้จ่ายที่ได้รับ สำหรับ การดำเนินการที่ได้รับ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ข้าพเจ้าขอ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเสนอราคาเป็น真面目 ณ ที่ท่านได้รับเอกสาร ๙๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวัฒนา ประชาน)

(นายวิภากร พัสดุภิญชัย)

เอกสารแบบท้ายสัญญาข้อที่ ๔-๔ หน้า ๓

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาไว้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๕. ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทอิมเมิร์ติธรรม และปราสาจากกลล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน<sup>โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน</sup>

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปกาศิทธิ หลากสุขถม)

ที่นั่นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6208160023068


รหัสอ้างอิง OTP rzNc

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี D๘๘๘๘๘๘๘๘๘๐๐๑

สำเนาถูกต้อง

๐๙๖๗

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



สำเนาถูกต้อง

๐๙๖๗

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)


ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เอกถ้าทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 3-5 ต.ลำพญาภิลักษณ์ อ.มาโนนากส์ จ.สระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บประมาณราคาก้อนเดียว หจก.ศันดาต้า และ หจก.มนรา 888

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ลำดับชั้นตาม สัญญา	ลำดับที่ ลักษณะ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคาน้ำหนัก	FN	ราคាត่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	1.1	งานดินคั่งทาง ภายนอก (EARTHWORK)							
3.1	1.1.1	งานดูดป่าและขุดตื้น งานดูดป่าและขุดตื้น ขุดดูบๆ (CLEARING AND GRUBBING) งานมีโครงสร้างทาง และเส้นทาง งานซ่อมแซมทางผืนทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	33,741.000	1.00	33,741.00	1.0331	34,857.83	
6.1	2.1.1	งานซ่อมแซมทางผืนทาง (SUBBASE) งานซ่อมแซมทางผืนทางและรองราก (SOIL AGGREGATE SUBBASE) งานซ่อมแซมเพิ่มเติมของชั้นราก (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	4,939.000	340.00	1,679,260.00	1.0331	351.25	1,734,843.51
7.1	2.1.2.1	งานซ่อมแซมเพิ่มเติมของชั้นราก (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,467.000	58.00	85,086.00	1.0331	59.92	87,902.35
8.1	2.1.3.1	งานมีหินทราย (SHOULDER) งานเปลือกหินทรายและหินราก (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	167.000	360.00	60,120.00	1.0331	371.92	62,109.97
	2.2	งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)							



สำเนาถูกต้อง 388
สำเนาถูกต้อง 388
สำเนาถูกต้อง 388
สำเนาถูกต้อง 388


(นางสาวอัมพร ประชานน
นักวิชาการพัฒนาปฏิการ

卷之三

— 13 —

卷之三

ก. ๒๗



388
LIPS
38
National Library of Thailand
Reference Section

၁၇၅

614


ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
(ພວກເຮົາ ສາທາລະນະລັດ)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐ /๑๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(.....นายเรืองศักดิ์ วราภูณ.....)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ເອກຕາມແນບທ້າຍສັບພູຜາຫຼື້ອທີ່... 2.4ທັງໝົດ...2...

1. ເອກສາຮູ້ຕົກເລີກເຈື່ອນໄຂ ນັກເກລີກທີ່ ສັບພູຜາແບບປັບປຸງຄາໄດ້
2. ກາຣດວາຈສອບຄໍາ K
 - ກາຣດ໌ເຈິນເທິງ ປົກຕື່
 - ກາຣດ໌ເຈິນຄົດເລະເຫັນໄນເຄີ້ງເຕື່ອງກັນ
 - ກາຣດ໌ຈານເຊົ້າເກີນເກລາສັບພູຜາ ຫຼື້ອກການເປີຍແທ້ຍົບຄໍາ K ເຕືອນທີ່
ສົງຊານ ກັບຄໍາ K ເຕືອນທີ່ນາດສັບພູຜາ
3. ທັນສື່ອ້ອງຂອງຄໍາ K ທີ່ເກີ່ນ 90 ວັນ
4. ຕ້າອຢ່າງຕັ້ງນີ້ຈາກຂອງການກະໜາທາງພາມີ້ຍື່ນ

ສຳເນົາຖຸກທ້ອງ

ອອກຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສະຖານະການພື້ນຖານປະຊຸມ

ເງື່ອນໄຂ ນັດກເກມທີ່ປ່ຽນທາງນາມກ່ອອົງຮ້າງ ຖຸດຕາເຊື້ອຕິການຄໍາວັດທີ່ໃຫ້ກັບສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້

ກ. ເງື່ອນໄຂແຂ່ງນັດກເກມທີ່

1. ສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ນີ້ໃຫ້ກັບທາງກ່ອອົງຮ້າງທຸກປະເທດ ລວງເຖິງການປັບປຸງແລະສ່ອມແຫງ່ງ
ທີ່ເປັນເຈົ້າຢ່າງຄ່າງຄາງໃນສັກສນະ ນັງດັບຄ່າຄ່າຮູກຄົມທີ່ທີ່ມີຄືນແລະສຳເນົາກ່ອອົງຮ້າງ ມາວະເງິນອຸດນຸນແລະໝາວດກາຍຈ່າຍສິ້ນ
ທີ່ເປັນເຈົ້າຢ່າງໃນຄັກສະນະຄ່າທີ່ດິນແລະສິ່ງກ່ອອົງຮ້າງ ທີ່ອໝາຍໃໝ່ເງື່ອນໄຂແຂ່ງນັດກເກມທີ່ຕາງທີ່ໄດ້ກຳນົດນີ້

2. ສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ນີ້ໃຫ້ທີ່ໃຫ້ໃນການເພີ້ມເກົດຄ່າງຄາງຈາກຄ່າງຄາງເດີນຕາມສັບຕະຫຼາມ ເນື້ອ
ດັບປີປຸງການ ປຶ້ງອັດທໍາຫຸ້ນໂຕຍກະທຽວທາລີ່ມໜີ ມີການເປີ້ມຢັນແປລງກູງທີ່ໄປ ນີ້ອັດຄອງຈາກເຕີງ ຂຸນະເນື້ອວັນເປີດຫອງ
ປະກວດການ ສໍານັກງານທີ່ຈັດຈ້າງໂດຍວິທີ່ນີ້ ໃຫ້ໃຫ້ກັບເປີດຂອງການແກ່ນ

3. ການນຳສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ໄປໃຫ້ນັ້ນ ສູ່ວ່າຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງແລະປະກາສໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງທ່ານ
ເໜີ ໃນປະກາສປະກວດການ ແລະຕ້ອງຈະບຸນຸໃນສັບຕະຫຼາມຈ້າງຕ້ວຍວ່າການຈ້າງແນ່ນນີ້ ຈະໃຫ້ສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້
ພ້ອມທີ່ກໍານົດປະເທດປະເທດຂອງການກ່ອອົງຮ້າງ ຖຸດຕາແລະວິທີການຄໍານະດົມ ທີ່ໄດ້ການປັບເທິງເກົດຄ່າງຄາງໄດ້ໃຫ້ຕ້ອງ

ໃນການທີ່ມີການກໍອລືກ້າງໜ່າຍປະເທດໃໝ່ການຈ້າງຄ່າງຄາງເຕີງກັນ ຈະຕ້ອງແກ່ປະເທດງານ
ກ່ອອົງຮ້າງແຕ່ປະເທດໃໝ່ກໍານົດປະເທດປະເທດໃໝ່ກັນນີ້ ແລະໃຫ້ສົດຄືສົ່ງກັບສຸດທິກໍານົດໄດ້

4. ການຂອງເງິນເພີ້ມຄ່າງຄາງກ່ອອົງຮ້າງຕາມສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ນີ້ ເປັນໜັ້ນທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຈະ
ຕ້ອງເຈີຍກ້ອອກກາຍໃນກຳນົດ 90 ວັນ ນັບຕ້ຳແຕ່ວັນທີຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຮັ່ງມອບງານຈາດຖຸດທ້າຍ ນາກພໍາກຳກຳນົດນີ້ໄປແສ້າ
ຜູ້ຮັບຈ້າງໄນມີສິ້ທີ່ຈະເຈີຍກ້ອອກເງິນເພີ້ມຄ່າງຄາງກ່ອອົງຮ້າງຈາກຜູ້ຈ້າງໄດ້ອີກຕ້ອງໄປ ແລະໃນການທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ
ເຮັດວຽກເງິນຕື່ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ໃຫ້ຜູ້ຈ້າງທີ່ເປັນຄູ່ສັບຕະຫຼາມເບີນເຮັດວຽກເງິນຕື່ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງໂດຍເຮົວ ບໍ່ໄວ້ໃຫ້ນັກຄ່າງຄາງຂອງ
ການຕ້ອງໄປ ເກືອຂໍໃຫ້ກັບເງິນຈາກນັດກປະກັນສັບຕະຫຼາມ ແລ້ວແຕ່ກົດ

5. ການທີ່ຈ່າຍຄໍານະດົມເງິນເພີ້ມທີ່ໃຫ້ກັບສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕ່າງໆຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມເງື່ອນໄຂ
ຂອງສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕ່າງໆຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ໃຫ້ຄໍານະດົມຕາງໆສຸດຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້
ວິວົງຈົ້ຍຂອງສໍານັກປະກວດການເປັນທີ່ຕື່ນແຜູດ

໬. ປະເທດທາງນາມກ່ອອົງຮ້າງແຂ່ງສຸດຕະຫຼາມທີ່ໃຫ້ກັບສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້

ໄນການທີ່ຈ່າຍເງິນເພີ້ມທີ່ໃຫ້ກັບສັບຕະຫຼາມແນມປ້າຍການໄດ້ ໃຫ້ຄໍານະດົມຕາງໆສຸດຕະຫຼາມທີ່ຕື່ນ

ສຳເນົາກູກທົອງ

ອົບພ

ກຳນົດໄດ້

P = (PO) X (K)

(ນາງສາວອັພເພຣ ປະຈຸບັນ)

ນັກວິຊາການພັດທະນາກົດປະກົດ

P = ຮາຄາຄ່າງຄາງຄ່າກ່ອອົງຮ້າງເວັບຍໍາເວັບຍໍາຄ່າງຄາງນີ້ໄປເຫັນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ
PO = ຮາຄາຄ່າງຄາງຄ່າກ່ອອົງຮ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄປເຫັນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ກ່ອນໄວ້ໃຫ້ໄວ້ໃໝ່ກູ່ງມູນແດ້ງແຕ່ກົດ

K = ESCALATION FATOR ທີ່ໄດ້ທັງ 4% ເປົ້າຫຼັກທີ່ຈ່າຍເງິນຕື່ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ
ເປົ້າໃໝ່ 1% ເປົ້າຫຼັກເຮັດວຽກຄ່າງຄາງຄ່າງ

หมวดที่ ๑ งานคุรุการ

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เม่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล นอท็อก ที่หักอาศัย และประทุม อัตเจักษ์ ยังແນເຢ່າ ຄະວ່າຍິນ້າ ໂຈລາດຖາ ຄສ້າຫຼັດ ໂງງານ ວ້າ ເປີນຕົ້ນ ແລະໃໝ່ນາຄວາມຮູນເຊື້ອ

- 1.1 "ไฟฟ้าของอาคารบูรจับตึงสายเนนด้านหน้า แต่ไฟรวมตึ่งหน้าห้องเปลี่ยนและระบบไฟฟ้าภายในบูรเจด"
 - 1.2 ประปาของอาคารบูรจับตึงท่อเมเนจ้านหน้า แต่ไฟรวมตึ่งระบบประปาภายในบูรเจด
 - 1.3 ระบบห้องน้ำอีกรอบสายตัวๆ ที่ติดเครื่องปั๊มน้ำส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องก้าช สายไฟหัวสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายสื่อรักษา ฯลฯ
 - 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายใน negot
 - 1.5 ตัวบันไดกลางบันที่ต้องเป็นล้านห้องอาคาร เช่นทางลับที่ติดกับอาคารโดยตัวห้อง เช่น ห้องน้ำ ห้องน้ำอีกรอบห้องน้ำ กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไฟรวมตึ่งเครื่องห้องน้ำอีกรอบที่นำเข้าไปในห้องน้ำบันไดตัวตัว เช่น ผู้พิพากษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องซูบบัน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
 - 1.6 ทางเท้าร่องอาคาร ตินมุน ตีนตัก น้ำจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{系数} \quad K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด

2.1 งานตีปิ้ง หมายถึง การขุดตีปิ้ง การตักตีปิ้ง การบดอัดตีปิ้ง การขุดเปิดหน้าที่นิน การเก็บกับดักตีปิ้ง การขุด – บดบดอัดแน่นเขื่อน คดอง ตันคดอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปูรีบดีงาน ดำเนินรับภาระดินให้หมายความถึงการบดตีปิ้งหรือทรายน้ำอัดด้วย ที่มีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถุง รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างตามที่เรียกว่าอนุกลปูรีบดี

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานปะรุงภูมิ EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNITREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้ค่า } K = 0.30 + 0.10(t/t_0) + 0.40 \cdot E/E_0 + 0.20 \cdot F/F_0$$

2.2 งานที่ไม่ใช้ชีวี หมายถึง งานที่ไม่สามารถให้ได้รับประโยชน์จากการนำมาใช้ในทางเศรษฐกิจ แต่ต้องดูแลรักษาไว้ให้ดี เช่น ไม้ หิน แร่ ฯลฯ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หินทรายที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหินทราย ฯลฯ

$$\frac{V_{\text{eff}}}{V_{\text{eff}} + V_{\text{ext}}} = 0.40 + 0.20 |U|_0 + 0.20 M_1/M_0 + 0.20 E_1/E_0$$

par

2.3 งานบริการและเปิดตัว หมายความว่า งานสาธารณะเบ็ดเตล็ดทั่ว ๆ ไป ที่จะต้องดำเนินการ เช่น จัดทำเอกสาร จัดทำงบประมาณ ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภายนอก สำหรับการนำเสนอ ให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใน หรือภายนอก ของสถาบัน

$$\text{กิจกรรม K} = 0.45 + 0.15\text{H}_2\text{O} + 0.10\text{M}_2\text{MO} + 0.20\text{H}_2\text{O}_2 + 0.10\text{H}_2\text{O}$$

ເທິດອານແນບໜ້າຍສົດມະລູກ້າຂອໍທີ່ 2.4 ແກ້ວ...5...

ห้องคหบดี ๓ ห้องที่ ๑

3.1 ការបន្ទាត់ការងារ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{系数 } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานเคลือบพื้น SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ໃໝ່} \text{ } K = 0.30 + 0.10 \text{ } Mv/Mo + 0.30 \text{ } Av/Ao + 0.20 \text{ } El/Eo + 0.10 \text{ } Et/Eo$$

3.3 งานก่อทราย ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{系数 } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mn/Mo} + 0.40 \text{ Al/Ao} + 0.10 \text{ Fe/Fo} + 0.10 \text{ Fe/E}$$

3.4 งานเชื่อมโครงสร้างที่ใช้เหล็ก เช่น งานภายดีง ผ้าดูดมันคอกอนกรีทที่ใช้เหล็กเสริม วีร์บูลและกอปต์ของตัวยึดตะแกรงเหล็กได้ใน
หรือตะแกรงขนาดเล็กกว่าตัวเชื่อมติด (WELDED STEEL WIREFARROW) เหล็กเตี้ยคาย (DOWEL BAR)
เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้เนื่องจากความแรงที่ต้องมีการดึงแห้งคอกอนกรีทเสริมเหล็ก
ตัว

$$15\text{nm}, V_0 = 0.20 \pm 0.10 \text{JW/L} \pm 0.05 \text{DW/L} \pm 0.05 \text{JW/L}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอหัง หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็กในร่างระบายน้ำและบริเวณจุดต่อตัวท่อน รวมทั้งงานปูอหังคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่น ที่มีรูปแบบและลักษณะงานค่าวัสดุคงที่ เช่น งานบ่อทักษ์ (MANHOLE) ท่อชั้นดินเผา ท่อชั้นดินเผาทึบ,

$$\text{ເຈົ້າອົດວ່າ } K = 0.35 + 0.20 \frac{I}{I_0} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{Sa}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดินดึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหล็กของคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หรือถังน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอิฐก้อนตั้งตัวคือบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กและถังก่อสร้างอื่นที่เป็นอิฐขนาดบล็อกตั้งตัวกัน

$$\text{系数 } K = 0.30 + 0.10V/V_0 + 0.15Ct/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$$

$$\text{系数 } K = 0.25 + 0.10V_0 + 0.05C_0/\text{Co} + 0.20M_0/\text{Mo} + 0.40S/\text{Fe}$$

หนังสือที่ ๑ ๒๕๖๓๐๙๑๗๘๗๔

(ແກ່ສາວລິນພຣ ປະຊາທິປະໄຕ)

Table 1: 0.10 + 0.20 mlo + 0.10coco + 0.10milk + 0.00stea

ເລກດຳລວມແນບທ້າຍຕື່ບູລູເຊື້ອທ...2.4..ແບ່ງ...6...

4.2 ຈານຂອາຄາຮັດປະຫວານບານເບີດ ແກ່ຍິ່ງ ລາຄາຮັດຄົນກົດເຊີງເລື່ອເຄີຍເຫຼືກຂົດຕ່າງໆ ທີ່ກົດສ້າງໃນແນບ
ກັນຄົດອາສົ່ງເນັ້ນເຊື້ອຄົດຂະບາຍນໍ້າ ເຊື່ອຄຸນຄູງຮະຕັບແຄນ໌ເວົ້າການນໍ້າ ໄດ້ແກ່ ທົ່ວລ່ານໍ້າເຫັນເນາ ທົ່ວຮະບາຍນໍ້າ
ປະຫວານບາຍນໍ້າ ອາຄາຮັດນໍ້າ ທົ່ວລົດແລະອາຄາຮັດປະຫວານນິດຂຶ້ນ ທີ່ນໍ້າຮະບາຍນໍ້າ ແຕ່ໄໝໄງ້ຈາກເຖິງຈາກອາຄາຮັດປະຫວານ
ໜາດໃຫດ່ ເຊັ່ນ ດ່າຍທາງຮະບາຍນໍ້າລັນເຊື້ອອາຄາຮັດປະຫວານປະກອບຂອງເຂົ້າອັນ ເປັນຕ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.10Ct/Co + 0.10Mf/Mo + 0.25St/S_0$$

4.3 ຈານບານຮະບາຍ TRASMRACK ແລະ STEEL LINER ນໍາມາຍິ່ງ ນານຮະບາຍແສີກເຄື່ອກກ້າວແລະໂຄຮຍກ
ການທັງ BU;K HEAD GATE ແລະ ຈານທົ່ວເຫຼືກ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.45Gv/G_0$$

4.4 ຈານເນັດີກເຊີງຄອນກົດ ແລະ ANCHOR BAR ນໍາມາຍິ່ງ ແລີກເລັ້ນທີ່ໃຊ້ເຕີມໃນຈານຄົນກົດແລະແຫຼັກ
ANCHOR BAR ຂອງຈານຝາຍ ທາງຮະບາຍນໍ້າລັນ ເຊື້ອອາຄາຮັດປະຫວານ ປະກອບຂອງເຂົ້າອັນ ທີ່ໄວ້ຕື່ບູລູແຍກຈ່າຍເຊີພາ
ຈານເນັດີກຕັ້ງກຳລ່າງ ເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.60S/S_0$$

4.5 ຈານຄອນກົດໄໝວຸນເຫຼືກ ແລະ ຄອນກົດເຊີງຄາດຄອນ

1 ນໍາມາຍິ່ງ ຈານຄອນກົດເຊີງເລີນແສີກທີ່ນັກສ່ວນຂອງເຫຼືກ
ອອກນາແຍກຕໍ່າງວັດຕໍ່າງໆາກຂອງຈານຝາຍ ທາງຮະບາຍນໍ້າລັນເຊື້ອອາຄາຮັດປະຫວານໄປຮະກອບຂອງເຂົ້າອັນ ທີ່ໄວ້ຕື່ບູລູແຍກ
ຈ່າຍເຊີພາຈານຄອນກົດຕັ້ງກຳລ່າວເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.40 + 0.15I/I_0 + 0.25Ct/Co + 0.20Mf/Mo$$

4.6 ຈານເຈົະ ນໍາມາຍິ່ງ ກາຣເຈະຫຼັອມທີ່ຜົ່ງທີ່ອົກຮູ່ນາຫຼູກໄນ້ໄຟຍກວ່າ 48 ມີລິເມຕົວ ໃນຂັ້ນທີ່ນິ້ນເຖິງເຊື້ອນິນ
ທີ່ແຕກນັກເພື່ອອັດືອັດືດັ່ງນັ້ນແລະໄຟຈາກເຖິງຈານຝາຍແຫຼັງນາດຫຼູກເວົ້າກອາຄາຮັດປະຫວານ ດນເມແລະອາຄາຮັດຕ່າງໆ ໂດຍກາ
ຫຼັດສືດນັ້ນປຸ່ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.10Mf/Mo + 0.20Ef/E_0 + 0.10Ff/F_0$$

4.7 ຈານຂື້ອື້ອື້ດັ່ງນັ້ນປຸ່ນ ສໍາເລັດືອັດືດັ່ງນັ້ນປຸ່ນຈະເທິງເຊື້ອຄົດ ໃຫ້ເສົາກະຮາຄາສີເບັງເຕີກທີ່ປັບປຸງແປດັກຕາງເທົ່ານີ້ຈາກ
ຂອງເຊີເບັງເຕີກທີ່ກ່ຽວກ່າວພາດມີຍື່ຍື່ດັ່ງນັ້ນໄມ້ເຕີມທີ່ສົ່ງ ການແຕ່ລະຈາກ ກັບເຫັນທີ່ປັບປຸງອຳປະກວດຮາຄາ
ກັງກວດທີ່ 5 ຈານຮະບັນຄົາກົງຕູກໂກຕົກ

5.1 ຈານວາງທຸກ AC ແລະ PVC

5.1.1 ໃນການເນື້ອງກັງຈ້າກເປົ້າກົງຕູກທຸກທັງໝົດ ແລະ ເຊື້ອຄົດປຸງເປັນໄຟ

ສິ້ນແນກຄຸກຕ້ອງ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.50 + 0.25I/I_0 + 0.25Mf/Mo$$

O&W

5.1.2 ໃນການເນື້ອງກັງກົງຕູກທຸກທັງໝົດ AC ແລະ ເຊື້ອຄົດປຸງເປັນໄຟ

(ນາງສາວອັນພຣ ປະບາບັນ)
ນັກວິຊາການພັດດຸປະງົບປິດການ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mf/Mo + 0.40Act/Act_0$$

5.1.3 ໃນການເນື້ອງກັງກົງຕູກທຸກທັງໝົດ PVC ແລະ ເຊື້ອຄົດປຸງເປັນໄຟ

$$\text{ໃຊ້ສູດ} \ K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mf/Mo + 0.40PVC/PVC_0$$

5.2 ຈານວາງທຸກທັງໝົດທີ່ມີການເປົ້າກົງຕູກທຸກທັງໝົດ POLY UHMWPE

5.2.1 ໃນການເນື້ອງກັງກົງຕູກທຸກທັງໝົດທີ່ມີການເປົ້າກົງຕູກທຸກທັງໝົດ

5.2.2 ໃນການເນື້ອຮັບຊ້າງເປັນຜູ້ອົດທາກທົ່ວເລີກແນ້ຳຍາແຕະເຫຼືອອຸປະກຣດ ແລະ ໄໃຈງານທີ່ຈານ TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.10E/E_0 + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ໃນການເນື້ອຮັບຊ້າງເປັນຜູ້ອົດທາກທົ່ວເລີກ HYDENSITY POLYETHYLENE ແລະ ເຫຼືອອຸປະກຣດ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.50 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.30PeI/PeO$$

5.3 ຈານປັບປຸງຮັບຄຸມໂນເຄົ່ານໍ້າແຂະງານ SECONDARY LINING

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.15E/E_0 + 0.35 GIPt/GIPo$$

5.4 ຈານວາງທົ່ວ PVC ຕຸ້ມເຫັນຄອນກົ້າດ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.20 Ct/Co + 0.05M/M_0 + 0.05St/S_0 + 0.30PV Ct/PV Co$$

5.5 ຈານວາງທົ່ວ PVC ກົບທາງ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.25 + 0.05It/I_0 + 0.05Mt/M_0 + 0.65PV Ct/PV Co$$

5.6 ຈານວາງທົ່ວເຄົ່າກະຕື

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.25 + 0.25It/I_0 + 0.50GIPt/GIPo$$

ປະເທດງານແລະຄູຕາໄປນ໌ເຄົ່າງຈາກກ່ອດຮ້າງທອງການໄຟ້ໄໝຢ່າງເມືືອແຕ່ງປະເທດໄທຢ່າງເກົ່ານິ້ນ

5.7 ຈານກ່ອດຮ້າງຮັບຄາຍຈົ່ງແງ່ຄູງແລະຄົມໄຟ້ໄໝຢ່າຍ

5.7.1 ຈານເຕີດຕັ້ງເຈົາໂຄງເນີກຄາຍສົ່ງແລະອຸປະກຣດ ລວມທັງຈານເຕີດຕັ້ງອຸປະກຣດໄຟ້ໄໝຄານໄຟ້ໄໝຢ່າຍ

ລໍາຮັບຈານເຕີດຕັ້ງ ເສົາ ໂຄງເນີກຄາຍສົ່ງແລະອຸປະກຣດ ປະກອບດ້ວຍ ສັກະນະຈານດັ່ງນີ້ ຄື້ອ

PRELIMINARY WORK (ຍົກເວັນ BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

ລໍາຮັບຈານເຕີດຕັ້ງອຸປະກຣດໄຟ້ໄໝຄານໄຟ້ໄໝຢ່າຍ ແນະຍິດ ເລັກະກາຈເຕີດຕັ້ງອຸປະກຣດໄຟ້ໄໝເກົ່ານິ້ນ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.60 + 0.20I/I_0 + 0.15 F/F_0$$

5.7.2 ຈານກ່ອດຮ້າງຮູ້ນເຕັກໄຟ້ໄໝ (TOWER FOUNDATION) ແລະ ຈານເຕີດຕັ້ງ BOUNDARY POST

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.35 + 0.20It/I_0 + 0.20Ct/C_0 + 0.10St/S_0 + 0.15F/F_0$$

5.7.3 ຈານກ່ອດຮ້າງຮູ້ນກາງທຸກປາການໄຟ້ໄໝຢ່າຍ

ສຳແນະງູກຕ້ອງ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.50 + 0.20It/I_0 + 0.15Ct/C_0 + 0.15St/S_0$$

ອົບລວມ

5.8 ຈານເຄື່ອແຂະດອດຕາຫຼິກຕາມກົ້າດຫຼັດແຮງ

5.8.1 ການແຫ້ງເຫັນຄອນກົ້າດຫຼັດແຮງ

(ນາງສາວົມພຣ ປະຫາຍນ)

ນັກວິชาກາກົດປົກປົງບົດ

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.35 + 0.15It/I_0 + 0.20Ct/C_0 + 0.30St/S_0$$

5.8.2 ການແຫ້ງເຫັນຫຼື້ນແທກ CAST IN PLACE

$$\text{ໃຊ້ຄູຕາ } K = 0.30 + 0.10It/I_0 + 0.25Ct/C_0 + 0.25St/S_0$$

ประเกณฑ์และสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่ออิฐห้องโถงขนาดใหญ่ที่ตั้งบนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่ออิฐห้องด้วยต่างๆ แบบแรงดันไฟฟ้า 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและเรื่องคุณภาพให้

$$\text{ให้สูตร } K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Ml/Mo + 0.05 Ft/Fo$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและเรื่องคุณภาพให้

$$\text{ให้สูตร } K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Ml/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wl/Wo$$

ตัวบัญชีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ให้กับลักษณะแบบปรับງวดราคานี้ได้ ดังที่ข้างต้นโดยกรุงเทพมหานคร

K	= ESCALATION FACTOR	
It	= ตัวบัญชีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Io	= ตัวบัญชีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Ct	= ตัวบัญชีราคาชีวะเบนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Co	= ตัวบัญชีราคาชีวะเบนต์ ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Mt	= ตัวบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและชิ้นส่วน) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Mo	= ตัวบัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและชิ้นส่วน) ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
St	= ตัวบัญชีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
So	= ตัวบัญชีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Gt	= ตัวบัญชีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Go	= ตัวบัญชีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
At	= ตัวบัญชีราคาแอลท์โลห์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Ao	= ตัวบัญชีราคาแอลท์โลห์ ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Et	= ตัวบัญชีราคาเครื่องจักรกลและเบร์กเมท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Eo	= ตัวบัญชีราคาเครื่องจักรกลและเบร์กเมท์ ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Ft	= ตัวบัญชีราคาเงินที่เดือนหนึ่งเรียว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
Fo	= ตัวบัญชีราคาเงินที่เดือนหนึ่งเรียว ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
ACL	= ตัวบัญชีราคาที่คิดเป็นเดือนที่ไม่ถูกต้อง ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	สำเนาดูด้วย
ACo	= ตัวบัญชีราคาที่คิดเป็นเดือนที่ไม่ถูกต้อง ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
PVCl	= ตัวบัญชีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ต่างๆ กันแต่ละงวด	
PVC0	= ตัวบัญชีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	(นางสาวอัมพร ประชาชน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
GIPt	= ตัวบัญชีราคาท่อเหล็กด้านสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	
GIP0	= ตัวบัญชีราคาท่อเหล็กด้านสังกะสี ในเดือนที่เปิดเผยของประกันราคากลาง	
Pel	= ตัวบัญชีราคาท่อ HYDRO METAL PVC ที่ต่างๆ กัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด	

- W1 = ດັ່ງນີ້ມີຄາຄາລາຍໄຟໄ້ໄວ ໃນເຕືອນທີ່ດໍາເງານແຕ່ລະຈາດ
W0 = ດັ່ງນີ້ມີຄາຄາລາຍໄຟໄ້ໄວ ໃນເຕືອນທີ່ປັດຈອນປະກວດຮາຄາ

ຄ. ຜົນກຳກັບສັດຍຸແນບປັບປຸງຮາຄາໄດ້

1. ການຄໍານວນຄ່າ K ຈາກສູງຕຽດຕາມເສັກຜະນະຈານນີ້ ໃນໄໝໃຫ້ດ້ວຍເຫຼືອດັ່ງນີ້ມີຄາຄາວັດຖຸກ່ອຕ້ອງກ່າວຂອງກະທຽວພາລິ້ຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ານຂອງປີ 2530 ເປັນເກດມີໃນການຄໍານວນ

2. ການຄໍານວນຄ່າ K ຕໍ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ມີເງານກ່ອສ້າງໜີລາຍປະເທດວຽກຂອງໃນສັດຍຸເທື່ອງກັນ

ຈະຕ້ອງແຍກຄ່າງານເກົ່າສ້າງແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ຕົກເຈນຕາມເສັກຜະນະຂອງຈານນີ້ ແລະໃນຕອດຄໍ້ອງກັບສູງຕຽດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄດ້

3. ການຄໍານວນຄ່າ K ກຳນົດໃນໄໝໃຫ້ເຫຼືອທະນີຍາ 3 ຕໍ່ແນ່ມາຫຼຸດຫຼັກຫຼັກຕອນໂດຍໄປວິການປັດເສີ່ງ ແລະກຳນົດໃຫ້ທຳເຫຼືອສັນຫັນ (ເປົ້າຍີນເທິຍບ) ໃນເປັນຄົດຈຳເນົາກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາຄລັກນີ້ປົກລົງກັບຕົວເລີຂອງທີ່ທີ່ນັ້ນເຫຼືອສັນຫັນນີ້

4. ໃຫ້ພົມຈານເຈີນເທິ່ງນີ້ຄົດຈາກຄ່າງານຈາກຮາຄາທີ່ຜູ້ຮັບຊ້າງທຳສັດຍຸຕອກຄາກັບຜູ້ວ່າຈ້າກ ເນື້ອຄ່າ K ຕາມສູງຕຽດສໍາເລັບຈານກ່ອສ້າງນີ້ ໃນເຕືອນທີ່ສູງມອບງານວິເຄົາເປົ່າເປົ່າຍີນແປດງໄປຈາກຄ່າ K ໃນເຕືອນປັດຈອນຮາຄາມາກກວ່າ 4% ຫຼັ້ນໄປ ໂດຍນຳເຫຼືອກະສ່ວນທີ່ກີນ 4 % ມາຄໍານວນປັບເທິ່ງນີ້ຄົດຄ່າງານເຕົ້ວແຕ່ກຣີນ (ໂຕຍໄມ້ຄືດ 4 % ແກ້ໄນ)

5. ໃນກຣີນທີ່ຜູ້ຮັບຊ້າງໄໝກາງຈາດທຳກາງກ່ອສ້າງໃຫ້ເຫຼືອຕາມຮະຍະເທລາໃນສັດຍຸໂດຍເປັນຄວາມສິດຂອງຜູ້ຮັບຊ້າງ ຄ່າ K ຕາມຈຸດວ່າງ ທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ໃນການຄໍານວນຄ່າງານໃຫ້ຄ່າ K ຂອງເຕືອນຈຸດທ້າຍຕາມຂອງສັດຍຸ ນີ້ອື່ນຄ່າ K ຂອງເຕືອນທີ່ສູມມອບງານຈົງ ແລ້ວແຕ່ວ່າຄ່າ K ຕົວໄດ້ຈະມີຄ່ານີ້ອຍກວ່າ


6. ກາງຈ່າຍເຈີນເຕີ່ຈະຈາດ ໃນຈ່າຍຄ່າຊ້າງຈານທີ່ຜູ້ຮັບຊ້າງທຳໄດ້ແຕ່ລະຈາດຕາມສັດຍຸໄປກ່ອນດ້ວນຄ່າງານເທິ່ງນີ້ຄ່າງານຄົດຄົງທີ່ຈະຄໍານວນໄດ້ຕ່ອນເຖິ່ງກ່ອງການທີ່ນີ້ມີຄາຄາວັດຖຸກ່ອຕ້າງຈຶ່ງນຳມາຄໍານວນກາຄ່າ K ຂອງເຕືອນທີ່ສູມມອບງານຈົງນີ້ ເປັນທີ່ແກ່ນອນແຮ້ວ ເນື້ອຄໍານວນເຈີນເທິ່ງໄດ້ໃຫ້ອໍາທຳກວານທົກຄອງເວົ້ອການເຈີນກັບລຳນັກງານປະມາດ

ສິນແນ້ງຢູ່ຕົ້ອງ

ອິຂົມ

(ນາງສາວອັມພຣ ປະຊາບ)
ຜູ້ກົງຫາການພັດປະປິບທິການ

สัญญาจดหนังสือสัมภาระ (Consortium)
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ສັງຄູງກິຈການຄ້າຮ່ວມ (Consortium)

ສັງຄູງຄະບັນນີ້ທຳເປັນເມື່ອວັນທີ ១៦ ສິງຫາຄມ ២៥៦២ ລນ ທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຂັນດາດ້າ ຕັ້ງອູ່ເລຂທີ ៣៨/១៩
ຕຳບລຮຣາເກຍມ ຄໍາເກອພຣະພຸທຮບາທ ຈັງຫວັດສະບຸຮີ

(១) ທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຂັນດາດ້າ ຈຳກັດ ໂດຍ ນາຍປາກສີຕີ ທລາກສຸຂອມ ທຸນສ່ວນຜູ້ຈັດກາ ແລ້ວ ຜູ້ມີອຳນາຈລົງນາມ
ຜູ້ກັນທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຂັນດາດ້າ ສໍານັກງານຕັ້ງອູ່ເລຂທີ ៣៨/១៩ ຕຳບລຮຣາເກຍມ ຄໍາເກອພຣະພຸທຮບາທ ຈັງຫວັດ
ສະບຸຮີ (២) ທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຮນຣາ ៨៨៨ ໂດຍ ນາຍຮຣາກທ່ຽນ ຮນອັກຣິນ ທຸນສ່ວນຜູ້ຈັດກາ ແລ້ວ ຜູ້ມີອຳນາຈລົງນາມ
ຜູ້ກັນທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຮນຣາ ៨៨៨ ສໍານັກງານຕັ້ງອູ່ເລຂທີ ២៦១/៣១ ຕະນະເທັກບາລ ២ ຕຳບປາກເພື່ອຍ່າ
ຄໍາເກອເມືອງ ຈັງຫວັດສະບຸຮີ

ຄູ່ສັງຄູງທະກລງວ່າມກັນທ້າສັງຄູງຄ້າຮ່ວມ (Consortium) ດັ່ງນີ້ມີຂໍ້ວານຕ່ອໄປນີ້

១. ຂໍ້ແລະທີ່ອູ່ຂອງສໍານັກງານ

ຄູ່ສັງຄູງທະກລງວ່າມກັນເພື່ອປະກອບຮູຮົກິຈກິຈການຄ້າຮ່ວມຊື່ອ “ກິຈການຄ້າຮ່ວມ (Consortium) ທ້າງທຸນສ່ວນ
ຈຳກັດຂັນດາດ້າ ແລ້ວ ທ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ຮນຣາ ៨៨៨” (ຊື່ຕ່ອໄປໃນສັງຄູນນີ້ຈະເຮີຍກວ່າ “ກິຈການຄ້າຮ່ວມ”)
ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານກິຈການຄ້າຮ່ວມຕັ້ງອູ່ເລຂທີ ៣៨/១៩ ຕຳບລຮຣາເກຍມ ຄໍາເກອພຣະພຸທຮບາທ ຈັງຫວັດສະບຸຮີ

២. ວັດທະນາ

ກ. ຄູ່ສັງຄູງຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກິຈການຄ້າຮ່ວມ (Consortium) ເພື່ອຢືນຂ້ອເສນອແລະເສນອຮາຄາທາງຮະບບຈັດຫຼືຈັດຈ້າງ
ກາກຮັງດ້ວຍອີເລັກທຣອນິກສ് ດ້ວຍວິທີປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສ (e-bidding) (ຊື່ຕ່ອໄປໃນສັງຄູນນີ້ຈະເຮີຍກວ່າ
“ໂຄຮກ”)

ໂຄຮກກ່ອສຮ້າງຄົນຄອນກົດເສີມເຫຼັກ ແມ່ນໆທີ ៣-៥ ຕ.ລຳພູງກາລາງ ອ.ມາວກເຫຼັກ ຈ.ສະບຸຮີ ១ ໂຄງການ
ຮາຍລະເອີດຕາມເອກສາປະກວດຮາຄາອີເລັກທຣອນິກສ (e-bidding) ເລຂທີ ១៨ / ២៥៦២ ລົງວັນທີ ១
ສິງຫາຄມ ២៥៦២

ខ. ຄູ່ສັງຄູງຈະເຂົ້າຮ່ວມປະກວດຮາຄາຈ້າງກ່ອສຮ້າງ ແລະລົງນາມສັງຄູງກັບທາງອົງກົດບັນດາການບໍລິຫານ
(ຊື່ຕ່ອໄປໃນສັງຄູນນີ້ຈະເຮີຍກວ່າ “ເຈົ້າຂອງການ”) ນາກກິຈການຄ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ໜະການປະກວດຮາຄາຈ້າງກ່ອສຮ້າງ
“ໂຄຮກ” ແລະດຳເນີນການຂາຍ “ໂຄຮກ” ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັງຄູງແລະບັນທຶກແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໜັນສື່ອ
ສັງຄູງກິຈການຄ້າຮ່ວມລົບນີ້ທີ່ອາຈມີ້ນ້ຳກາຍຫລັງ

ສຳເນົາໂຫຼງຫ່າຍ

ອິດຍ

(ນາງສາງຍັນພຣ ປະຫາຍນ)
ນິກວິຊາການພັດປຸງບົດການ

๓. การบริหารงานกิจการค้าร่วม (Consortium)

๓.๑ คู่สัญญาตกลงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า เป็นผู้ร่วมค้าหลักในกิจการค้าร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบกิจการหลักในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กับทางหน่วยงานราชการ โดยให้ นายปกาศิต หลากสุขุม เป็นผู้รับมอบอำนาจ มีสิทธิลงนามเสนอราคาและทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การเจรจาต่อรอง และตัดสินใจกระทำการใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับงาน “โครงการ” โดยใช้หนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า

๓.๒ คณะกรรมการบริหารและการควบคุมกิจการค้าร่วม (Consortium) จะประกอบด้วยบุคลากรที่แต่งตั้งโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายฯ ละ ๑ คน โดย

๓.๒.๑ คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะต้องมีมติเป็นเอกฉัน ทั้งนี้ โดยถือหลักต้องที่ถ้อยอาคัยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการค้าร่วม (Consortium)

๓.๒.๒ การประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะมีขึ้นตามความจำเป็นของงานโครงการ เวลาและสถานที่ ประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารและการควบคุมนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะเป็นผู้กำหนด โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ มติการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุม จะต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้คู่สัญญาหมดโดยไม่ชักช้า

๓.๓ เอกสารการรับเงิน การอ扣เอกสารรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดในกลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium) แต่ละรายจะต้องออกเอกสารการรับเงินให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามส่วนงาน และจำนวนที่ได้รับ โดยออกเอกสารรับเงินในนามของตนเอง (หรือตามตกลงกัน)

๓.๔ การเสียภาษี การดำเนินการตามสัญญา กิจการค้าร่วม (Consortium) “ไม่ถือเป็นหน่วยภาษี ดังนั้น กิจการค้าร่วม (Consortium) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า ฝ่ายเสียภาษีเงินได้ และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นเพียงผู้เดียว

๗๘๙๖๙๙๙๙๙๙

๐๒๗

(นางสาวชั้นพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๔. หน้าที่...

เอกสารแบบฟ้ายื่นญาชั้ตที่ ๑๕ หน้า ๑

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเป็นปันกิ้นกำไรและขาดทุนของงานตามอัตราการลงทุนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้ (หรือ
ตกลงกันเป็นเงื่อนไขอื่น)

๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า ร้อยละ ๘๕

๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ๘๘๘ ร้อยละ ๕

๕. ค่าใช้จ่ายในการประกวดราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว รวมไป
ถึงหนังสือค้าประกันสัญญาจ้าง ที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า จะเป็นผู้ออก หรือ ชำระแต่เพียงผู้เดียว

๖. ข้อสัญญาอื่น ๆ (ตามที่กลุ่มผู้ร่วมค้าตกลงร่วมกัน)

๗. ผลงานในการก่อสร้างโครงการตั้งแต่ต่อไปนี้ ให้ออกให้กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ๘๘๘

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า^{ลาย}
ลงชื่อ.....
(นายปกาศิต หลากสุขณ)



(ประทับตราของหจก ฯ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ๘๘๘
ลงชื่อ.....
(นายธราภรณ รอนอัครวิน)



(ประทับตราของหจก ฯ)

สำเนาถูกต้อง

ลาย

ลงชื่อ..... พยาน

(นายวิรุพท์ เข้าถ้ำทอง)

ลงชื่อ..... พยาน (นางสาวอัญพร ประชาษน)

(นายบุญเลิศ สุขสวัสดิ์)

บัญชีการพัสดุปฏิการ
